



Redegørelse om Anlægs- og Renoveringsfonden 2020



Indhold

Sammenfatning	1
1. Formålet med Anlægs- og Renoveringsfonden	2
2. Opgørelse af Anlægs- og Renoveringsfonden	3
2.1. Bevægelser i 2020.....	3
2.2. Udvikling de sidste 10 år.....	4
2.3. Projektstatus.....	5
3. Projekter i Anlægs- og Renoveringsfonden	6
3.1. Fordeling af projekter på hovedkonti.....	6
4. Økonomien for udvalgte projekter.....	8
4.1. Nye projekter i 2020	8
4.2. Åbne projekter over 50 mio. kr.	10
4.3 Status for de 25 største projekter	11
Bilag	14
Bilag 1: Fordeling af projekter på hovedkonti	14
Bilag 2: Projektstatus	26
Bilag 3: Lovgrundlag for Anlægs- og Renoveringsfonden.....	36

Sammenfatning

Denne redegørelse for finanslovsåret 2020 er nr. 21 i rækken af redegørelser om bevægelserne i Anlægs- og Renoveringsfonden.

Primo 2020 var Anlægs- og Renoveringsfondens beholdning på 1.213 mio. kr. I 2020 blev der bevilget 414 mio. kr. og forbrugt 548 mio. kr. Ultimo 2020 var Anlægs- og Renoveringsfondens beholdning på 1.079 mio. kr., hvilket var en formindskelse af Anlægs- og Renoveringsfonden med 134 mio. kr. fra primo samme år. Disse tal er eksklusivt udlån på nedenstående hovedkonti, og kan derfor ikke afstemmes med Landskassens regnskab.

- 20.30.07 – Boligstøtte, renter og afdrag, netto
- 87.72.17 – Boligstøtte, selvbyggerhuse
- 87.72.23 – Boligstøtte, istandsættelsestilskud
- 89.72.11 – Støttet privat boligbyggeri

Se tabel 2.1 for en opgørelse der kan afstemmes med Landskassens regnskab.

1. Formålet med Anlægs- og Renoveringsfonden

Formålet med oprettelsen af Anlægs- og Renoveringsfonden var at gøre procedurerne omkring bevilling af midler til anlægsopgaver mere smidige.

Selvstyret afsætter hvert år et beløb til anlægs- og renoveringsopgaver i Finansloven, den såkaldte anlægsramme. Anlægsrammen er sektorfordelt, hvor der inden for hver sektor foretages prioritering af konkrete anlægsopgaver.

Projekterne i Anlægs- og Renoveringsfonden varetages af flere sektorer, som er de forskellige departementer, Mittarfeqarfiit, Nukissiorfiit og kommunerne.

Anlægs- og Renoveringsfonden er en budgetteknisk fond¹, der ikke kan søges midler fra. De midler, der er registreret i fonden, sker ved vedtagelse af den årlige Finanslov, og disse er bundet til konkrete projekter. Skal der rokeres midler fra fonden, skal dette ske ved at aflyse eller ændre et givent projekt, hvilket kræver politisk godkendelse af Inatsisartut eller Inatsisartuts Finans – og Skatteudvalg.

¹ Se bilag 3 Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber, kapitel 4 om finanslovs, årsbudget mv., §14-17 om anlæg, renovering mv.

2. Opgørelse af Anlægs- og Renoveringsfonden

2.1. Bevægelser i 2020

Tallene i denne redegørelse er baseret på udtræk fra Selvstyrets økonomisystemer og er identiske med de tal der registreres i landskassens regnskab. Tabel 2.1 viser opgørelsen for Anlægs- og Renoveringsfonden i 2020 hvor "Total for A&R fonden" kan afstemmes direkte med landskassens regnskab.

Tabel 2.1 - Opgørelse af A&R fonden 2019 (i 1.000 kr.)

Beskrivelse	Primo 2020	Bevilling 2020	Forbrug 2020	Ændring 2020	Ultimo 2020
Projekter	-1.212.966	-414.002	548.285	134.283	-1.078.683
Periodisering	174	-500	421	-79	95
Regulering fra lukkede projekter	0	326.636	-326.070	566	566
Total for redegørelsen	-1.212.792	-87.866	222.636	134.770	-1.078.022
Hovedkonto 20.30.07	-9.133	495	-281	214	-8.919
Hovedkonto 87.72.17	-7	0	0	0	-7
Hovedkonto 87.72.23	-11.126	0	984	984	-10.142
Hovedkonto 89.72.11	-59.399	92.514	-19.471	73.043	13.644
I alt	-1.292.457	5.143	203.868	209.011	-1.083.446

Redegørelsen for Anlægs- og Renoveringsfonden dækker fra 2010 ikke hovedkonto 89.72.11 (Støttet privat boligbyggeri). Fra 2016 dækker redegørelsen heller ikke hovedkonto 20.30.07 (Boligstøtte, renter og afdrag, netto). Fra 2019 dækker redegørelsen endvidere ikke 87.72.17 (Boligstøtte, selvbyggerhuse) og 87.72.23 (Boligstøtte, istandsættelsestilskud). Disse konti er derfor kun medtaget for at kunne afstemmes med landskassens regnskab. Alle disse konti omfatter udlånssager.

Primo 2020 var A&R fondens beholdning på 1.213 mio. kr. eksklusiv de fire nævnte hovedkonti.


I 2020 blev der bevilget 414 mio. kr. og forbrugt 548 mio. kr.

Ultimo 2020 var A&R fondens beholdning dermed 1.078 mio. kr., hvilket var en reducere af Anlægs- og Renoveringsfonden med 134 mio. kr.


2.2. Udvikling de sidste 10 år

Bevillingerne i 2020 udgjorde 414 mio. kr., mens forbruget udgjorde 548 mio. kr. Det har medført en reducereing af Anlægs- og Renoveringsfonden på 134 mio. kr.

Den historiske udvikling kan aflæses af de nedenstående figurer.

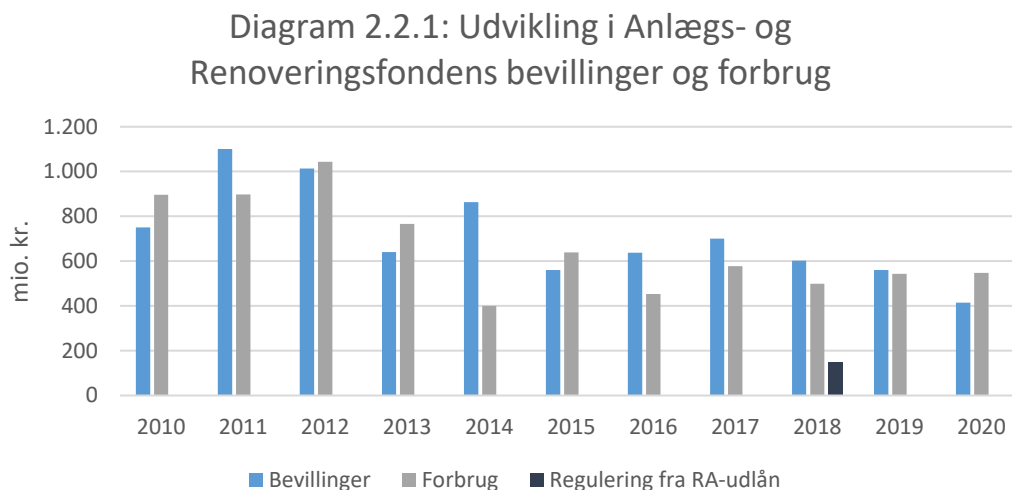

Kilde: Selvstyrets økonomisystem

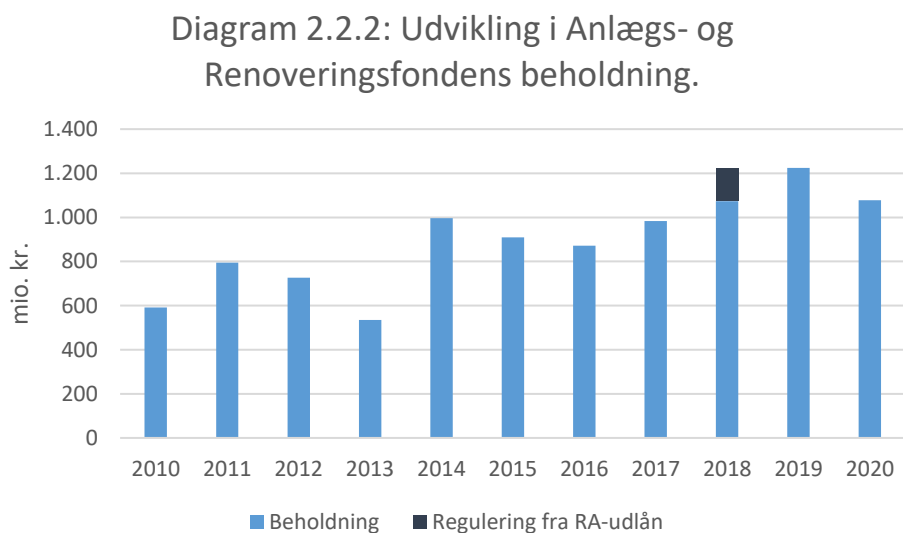

Kilde: Selvstyrets økonomisystem

Alle tal er opgjort eksklusiv hovedkonto 20.30.07, 89.72.11, 87.72.17 og 87.72.23 og kan derfor ikke direkte sammenlignes med landskassens regnskab.

2.3. Projektstatus

I 2020 var der 39 nye projekter, 194 projekter er videreført fra tidligere år, mens der var 2 passive projekter. I alt var der 234 åbne projekter ultimo 2020.

Projekternes status beskrevet i tabel 2.3 herunder. Se yderligere detaljer i bilag 2.

Tabel 2.3: Projektstatus

Projektstatus	Antal projekter
Videreførte projekter	194
Passive projekter	1
<i>Projekter under afslutning i 2020</i>	23
Åbne projekter primo	218
Nye projekter i 2020	39
<i>Projekter under afslutning i 2020</i>	23
Åbne projekter ultimo	234
Øvrige projekter under afslutning	35
<i>Projekter under afslutning i 2020</i>	23
Projekter i alt	292

3. Projekter i Anlægs- og Renoveringsfonden

3.1. Fordeling af projekter på hovedkonti

De fem største hovedkonti (målt i disponible midler) var 83.30.13 "Landsdækkende institutioner", 89.72.12 "Boligprojekter og erstatningsbyggeri", 87.75.01 "Nyt skib til Pinngortitaleriffik", 86.60.01 "Sundhedsvæsenet" og 84.40.15 "Kollegiebyggeri". Se yderligere detaljer i bilag 1.

Kolonnen 'Rest til disponering' dækker over den del af bevillingen, der endnu ikke er indgået kontrakter på pr. 31-12-2020. Til denne skal det nævnes, at der ikke disponeres over uforudsete udgifter, administrationsomkostninger, rejseudlæg osv. I forhold til redegørelsen for 2019 er der i 2020 disponeret for mindre. Hvilket blandt er påvirket af, at der i redegørelsen for 2019 er inkluderet data indtil maj 2020 for indgåede kontrakter.

Tabel 3.1: Fordeling af projekter på hovedkonti (i 1.000 kr.).

Hovedkonto	Projekter	Primo 2020	Bevilling 2020	Disponibel 2020	Forbrug 2020	Ultimo 2020	Forbrug i %	Rest til disponering
011014 Reserve til ny Landstingssal	2	1.415	0	1.415	- 1	1.414	-	1.047
011015 Anlæg og vedligehold under Inatsisartut	1	1.941	0	1.941	- 5	1.936	-	1.725
758620 Miljø, anlæg	1	0	0	0	0	0	-	0
800010 Tilbageførslser fra Anlægs- og renoveringsfonden	1	2.513	0	2.513	0	2.513	-	0
800080 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer	1	0	3.000	3.000	- 11.500	3.000	-383%	3.000
812002 Indretning af serverrum	1	0	0	0	0	0	-	0
822002 Pisariillisaaneq-projektet, ERP	1	- 1.989	18.200	16.211	- 12.182	4.029	-4%	8.629
822401 Administrative systemer mv. i Skattestyrelsen	2	0	3.600	3.600	0	3.600	0%	3.600
822402 Nyt IT-system	1	0	0	0	0	0	-	- 1.975
833012 Ældreinstitutioner	10	49.622	- 22.925	26.697	6.452	33.149	-28%	- 11.942
833013 Landsdækkende institutioner	23	84.084	20.215	104.299	- 5.818	98.481	-29%	48.101
844009 Erhvervsuddannelsesområdet	3	- 209	0	- 209	0	- 209	-	367
844010 Kommunale skoler	15	68.327	- 175.000	- 106.673	103.026	- 3.647	-59%	- 121.765
844012 Uddannelsesbyggeri	12	22.752	3.000	25.752	- 15.194	10.558	-506%	8.535
844014 Kultur- og idrætsbyggeri	2	8.099	- 1.200	6.899	- 4.682	2.217	390%	1.664
844015 Kollegiebyggeri	19	119.267	49.998	169.265	95.175	264.440	190%	112.039
844016 Kulturbyggeri	2	- 219	- 4.200	- 4.419	4.169	- 250	-99%	- 4.482
844017 Institutioner for børn og unge	3	18.187	- 18.000	187	- 2	185	0%	- 2
844501 Kirken	2	102	0	102	0	102	-	12
855020 Turismeanlæg	4	25.500	- 10.100	15.400	0	15.400	0%	15.400
866001 Sundhedsvæsenet	33	115.470	62.351	177.821	- 35.385	142.436	-57%	- 37.080

Tabel 3.1: Fordeling af projekter på hovedkonti (i 1.000 kr.).

Hovedkonto	Projekter	Primo 2020	Bevilling 2020	Disponibel 2020	Forbrug 2020	Ultimo 2020	Forbrug i %	Rest til disponering
870088 Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter	3	1.941	- 4.225	- 2.284	9.106	6.822	-216%	- 4.767
871106 5-års eftersyn	5	184	- 115	69	454	523	-395%	144
871109 Transportkommissionen - forundersøgelser	1	30.001	11.000	41.001	- 2.805	38.196	-26%	20.672
877002 Køb af administrationsbygning	2	0	0	0	0	0	-	0
877003 Vestnorden Foresight 2030 - bygdernes fremtidsvisioner	1	0	0	0	0	0	-	0
877208 Reinvst. hjem. Udlejningsboliger	1	0	0	0	0	0	-	0
877210 Personaleboliger i Nuuk	1	7.812	2.000	9.812	- 162	9.650	-8%	8.988
877213 (tom)	5	4.480	- 4.400	80	- 3	77	0%	2.425
877221 Støttet kommunalt udlejningsbyggeri	4	- 1.556	0	- 1.556	0	- 1.556	-	- 1.556
877222 Boligprogram for bygder og yderdistrikter	6	- 1.129	- 26.902	- 28.031	30.670	2.639	-114%	- 32.232
877225 Sanering af udlejningsboliger mm	1	0	0	0	0	0	-	0
877310 Havneanlæg	3	5.780	- 1.000	4.780	0	4.780	0%	2.035
877312 Reinvestering i havne og kajanlæg	7	36.273	39.050	75.323	- 47.388	27.935	-121%	5.872
877319 Forundersøgelser for diverse trafik anlæg	1	0	- 147	- 147	147	0	-100%	- 147
877320 Udbygning af landingsbanestruktur	11	8.500	3.000	11.500	- 116	11.384	-4%	11.444
877322 GLV - landingspladser	16	31.775	36.000	67.775	- 42.639	25.136	-118%	32.530
877501 Nyt skib til Pinngortitaleriffik	1	83.228	47.000	130.228	- 88.395	41.833	-188%	118.504
877502 Miljøafbødende foranstaltninger på Dundas	1	1	0	1	0	1	-	1
877503 Tilskud til kommunale miljøanlæg	1	4.542	0	4.542	- 2.104	2.438	-	95
897140 Nukissiorfiit, anlægsudlån	7	282.600	- 184.500	98.100	- 98.100	0	100%	0
897141 Nukissiorfiit, anlægsudlån, byggemodning	4	48.600	- 48.600	0	0	0	0%	95.400
897212 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri	70	155.047	279.266	434.313	- 116.433	317.880	-42%	- 31.289
822003 IT-systemer til socialområdet	1	0	11.000	11.000	0	11.000	0%	11.000
Afrunding Primo excl. Lukkede projekter		25						
Periodisering		-174	500		-421	91		
Hovedtotal	292	1.212.792	87.866	1.300.658	- 222.636	1.078.022	-173%	325.992

4. Økonomien for udvalgte projekter

4.1. Nye projekter i 2020

Der blev registreret 39 nye projekter i 2020. Projekternes bevillinger udgjorde i alt 295 mio. kr., svarende til ca. 71% af de samlede anlægsbevillinger i 2020. Se yderligere detaljer i bilag 2.

Tabel 4.1: Nye projekter i 2020 (i 1.000 kr.)

Finanslov	Projekt	Projekttitel	Bevillinger 2020	Forbrug 2020
800080	80802	Disp. til påpg.projekteringer	3.000	
822003	40089	Fælles kommunalt ESDH-system til socialområdet	11.000	
822401	90024	Administrative systemer mv. i Skattestyrelse	3.600	
833013	40084	Genopførelse af udslusninghjem, Uummanaq	5.315	3.750
833013	40086	Døgninstitution for børn med sindslidelser	6.000	-32
833013	40087	Institution for børn og voksne med multihandicap	6.000	
833013	40090	Etablering af satellitafdeling til Pilutaq	3.000	-2.749
833013	40091	Najugaqarfik Elisibannguaq-nybyg og renovering	6.900	-296
844012	51026	Landbrugsskole i Upernaviarsuk	3.000	-54
855020	72010	Nuuk Natur- og geopark	4.750	
855020	72011	Nationale seværdigheder	-4.650	
866001	46031	Projektering af ny sengefløj og patienthotel	1.000	
866001	46032	Rømning af byggegrund	3.000	
870088	29108	Vej mellem Sisimit og Kangerlussuaq	5.000	
871106	73015	5-års eftersyn, 2020	500	-280
877312	24136	Etablering af anløbsfaciliteter	4.150	-667
877320	25199	Narsaq	1.000	-9
877320	25200	Nanortalik	1.000	-15
877320	25204	Uummanaq, landingsbane	1.000	-6
877322	25212	Slidlagsbelægning, Qaarsut landingsbane	5.900	-6.804
877322	25213	Hangar til helikopter	26.000	-16.870
897140	17777	Udlån til Nukissiorfiit, 2020	60.000	-60.000
897140	21077	Etabl. af vandkraftværk i Kulusuk	18.100	-18.100
897211	37055	Støttet privat boligbyggeri, 2007	-39.800	
897212	30028	Legeplads til skolen, Nuussuaq (UPV)	1.200	-701
897212	31050	Renovering af altaner, Qaqortoq	16.700	-3.801
897212	31051	Renovering af altaner, Paamiut	11.400	-3.457
897212	31053	Renovering af altaner, Maniitsoq	19.800	-3.973
897212	31055	Renovering af altaner, Sisimiut	15.000	-776
897212	31058	Skimmel renovering, Qaqortoq	2.000	
897212	31059	Skimmel renovering, Maniitsoq	2.000	

Tabel 4.1: Nye projekter i 2020 (i 1.000 kr.)

Finanslov	Projekt	Projektitel	Bevillinger 2020	Forbrug 2020
897212	31060	Skimmel renovering, Sisimiut	5.000	
897212	31062	Skimmel renovering, Aasiaat	1.500	
897212	31063	Skimmel renovering, Ilulissat	2.000	
897212	31064	Nedrivning af BSU-huse	8.200	-43
897212	31065	Renovering af Eqalugalinnuit, Nuuk	12.900	-61
897212	31066	Fornylse af installationer i flere byer	45.200	
897212	32140	Ungdomsboliger - typehus	2.300	
897212	32141	Ungdomsboliger 2021, Qaanaaq	14.600	-67
Hovedtotal			294.565	-115.011

4.2. Åbne projekter over 50 mio. kr.

Der var 29 projekter med en total bevilling på over 50 mio. kr. i 2020. Se yderligere detaljer i bilag 1-2.

Tabel 4.2: Åbne projekter over 50 mio. kr. (i 1.000 kr.).

Projektnr.	Projekttitel	Hovedkonto	Total bevilling ultimo 2020	Total forbrug ultimo 2020
34527	Diverse renovering og sanering	897212	249.755,00	-193.004,00
61003	Nyt skib til Pinngortitaleriffik	877501	220.000,00	-178.167,00
50131	Ny skole i Ilulissat	844010	192.655,00	-192.453,00
24116	Reinvestering i havne og kaj anlæg	877312	144.669,00	-141.256,00
34517	Byhuse	897212	144.002,00	-144.001,00
52114	218 sengepladser, Nuuk	844015	119.500,00	-5.513,00
50069	Ren/ombygn.udv. skole Qaqortoq	844010	115.700,00	-114.764,00
47055	Diverse nyanlæg og renovering	866001	110.000,00	-146,00
52087	Erstaningsbyggeri for NI+GU, Qaoqrotq	844012	104.400,00	-103.930,00
31048	Renovering af altangange og altaner, Nuuk	897212	96.100,00	-77.181,00
28029	Særlige byggemodning i Qinngorput	897141	95.400,00	-95.400,00
47051	Apparaturpuljen	866001	89.600,00	-69.015,00
52061	Udvidelse af GU, Aasiaat	844012	89.400,00	-89.583,00
23004	Transportkommissionen - forundersøgelser	871109	82.153,00	-43.957,00
39041	Genhusning efter oversvømmelse	897212	81.554,00	-108.688,00
47053	Vedligeholdelseefterslæb	866001	80.000,00	-70.753,00
17775	Udlån til Nukissiorfiit, 2018	897140	78.400,00	-78.400,00
30017	Bæredygtige boliger 2016, Sisimiut	897212	76.710,00	-74.667,00
90022	Pisariillisaaneq-projektet, ERP	822002	75.942,00	-71.912,00
32090	Støttet kom. udl.byggeri, 2009	877221	69.800,00	-71.355,00
46017	Patienthotel, Nuuk	866001	66.522,00	-66.524,00
51013	Udvidelse INUILLI, Narsaq	844009	61.400,00	-61.609,00
17777	Udlån til Nukissiorfiit, 2020	897140	60.000,00	-60.000,00
17774	Udlån til Nukissiorfiit, 2017	897140	60.000,00	-60.000,00
40054	Landsdækkende handicap træningscenter	833013	56.269,00	-55.032,00
40067	Pulje til nyanlæg og renovering	833013	54.120,00	-31,00
47031	Udbygning DIH - fondsmidler	866001	53.428,00	-55.257,00
51010	Entreprenør og bjergværksskole, Sisim	844009	52.200,00	-52.200,00
52113	72 sengepladser, Sisimiut	844015	50.050,00	-749,00
Hovedtotal			2.829.729,00	-2.335.547,00

4.3 Status for de 25 største projekter

Nedenfor fremgår status for de 25 største projekter målt på den totale bevilling ultimo 2020. Her er der tale om projekter, som endnu ikke er sendt til intern revision.

Tabel 4.3: 25 største projekter (i 1.000 kr.).

Projektnr.	Projektitel	Finanslov	Total bevilling ultimo 2020	Total forbrug ultimo 2020	Status
34527	Diverse renovering og sanering	897212	249.755	- 193.004	Projektet er en puljebevilling til gennemførelse af mange mindre opgaver – opgaver i henhold til sektorplanerne udbydes løbende, hvor der tages højde for øvrige opgaver hvert sted, og behov for beskæftigelse.
61003	Nyt skib til Pinngortitaleriffik	877501	220.000	- 178.167	Sidste ratebetaling betales i 2021, hvor skibet bliver afleveret. Lukkes i 2021.
24116	Reinvestering i havne og kaj anlæg	877312	144.669	- 55.481	Projektet er en puljebevilling til gennemførelse af mange mindre opgaver – opgaver i henhold til sektorplanerne udbydes løbende, hvor der tages højde for øvrige opgaver hvert sted, og behov for beskæftigelse.
52114	218 sengepladser, Nuuk	844015	119.500	- 5.513	Opgaven er på opstartsfasen i 2021.
47055	Diverse nyanlæg og renovering	866001	110.000	- 146	Projektet er en puljebevilling til udmøntning til udførelse efter endt licitation – i henhold til det 2-delte bevillingsprincip. Udmøntes løbende og i henhold til afholdte og tilfredsstillende licitationer.
31048	Renovering af altangange og altaner, Nuuk	897212	96.100	- 77.181	Opgaven er udført, og er under 1 års eftersynsperiode
28029	Særlige byggemodning i Qinnngorput	897141	95.400	- 95.400	Lukkes i 2021
47051	Apparaturpuljen	866001	89.600	- 69.015	Projektet er en puljebevilling til indkøb af apparatur og som udbydes efter behov, samt ledige midler.
23004	Transportkommissionen - forundersøgelser	871109	82.153	- 41.848	Projektet er en puljebevilling til gennemførelse af mange mindre opgaver – herunder særligt rådgivningsopgaver i forbindelse med udbygning af landets infrastruktur.

Tabel 4.3: 25 største projekter (i 1.000 kr.).

Projektnr.	Projektitel	Finanslov	Total bevilling ultimo 2020	Total forbrug ultimo 2020	Status
39041	Genhusning efter oversvømmelse	897212	81.554	- 108.688	Opgaven er udført, og er under 1 års eftersynsperiode – TB til rokering af 30 mio. kr. statsstøtte sker i 2021.
47053	Vedligeholdelseefterslæb	866001	80.000	- 70.753	Projektet er en puljebevilling til gennemførelse af mange mindre opgaver – opgaver i henhold til sektorplanerne udbydes løbende, hvor der tages højde for øvrige opgaver hvert sted, og behov for beskæftigelse.
17775	Udlån til Nukissiorfiit, 2018	897140	78.400	- 78.400	Lukkes i 2021
30017	Bæredygtige boliger 2016, Sisimiut	897212	76.710	- 74.667	Blok 3 er under udførelse, og Blok 1 & 2 er under 1 års eftersynsperiode.
90022	Pisariillisaaneq-projektet, ERP	822002	75.942	- 35.764	Projektet er en puljebevilling til gennemførelse af mange mindre opgaver i forbindelse med ERP-projekter.
32090	Støttet kom. udl.byggeri, 2009	877221	69.800	- 71.355	Lånekonto
46017	Patienthotel, Nuuk	866001	66.522	- 66.524	Forlig om udestående i forbindelse med 5 års gennemgang indgået primo 2021. Lukkes i 2021.
17774	Udlån til Nukissiorfiit, 2017	897140	60.000	- 60.000	Lukkes i 2021
17777	Udlån til Nukissiorfiit, 2020	897140	60.000	- 60.000	Anlægs lån til Nukissiorfiit udbetales efter anmodning herom fra virksomheden.
40054	Landsdækkende handicap træningscenter	833013	56.269	- 55.032	Opgaven er udført, og er under 1 års eftersynsperiode
40067	Pulje til nyanlæg og renovering	833013	54.120	- 31	Projektet er en puljebevilling til udmøntning til udførelse efter endt licitation – i henhold til det 2-delte bevillingsprincip. Udmøntes løbende og i henhold til afholdte og tilfredsstillende licitationer.
47031	Udbygning DIH - fondsmidler	866001	53.428	- 55.257	Forlig om udestående i forbindelse med udførelse er indgået primo 2021. Lukkes i 2021.
52113	72 sengepladser, Sisimiut	844015	50.050	- 749	Opgaven er på opstartsfasen i 2021.
31037	Skimmel renovering	897212	49.200	- 33.827	Projektet er en puljebevilling til

Tabel 4.3: 25 største projekter (i 1.000 kr.).

Projektnr.	Projektitel	Finanslov	Total bevilling ultimo 2020	Total forbrug ultimo 2020	Status
					gennemførelse af mange mindre opgaver – opgaver i henhold til sektorplanerne udbydes løbende, hvor der tages højde for øvrige opgaver hvert sted, og behov for beskæftigelse.
30015	Alsidige boliger 2015, Maniitsoq	897212	46.600	- 46.820	Opgaven er udført, og er under 1 års eftersynsperiode
31066	Fornyelse af installationer i flere byer	897212	45.200	0	Projektet er en puljebevilling til gennemførelse af mange mindre opgaver – opgaver i henhold til handleplan udbydes løbende, hvor der tages højde for øvrige opgaver hvert sted, og behov for beskæftigelse.
Hovedtotal			2.210.972	-1.533.622	

Bilag

Bilag 1: Fordeling af projekter på hovedkonti

Finanslo v	Projekt dimension	Projekt titel	Primo 2020	Bevilling 2020	Disponibel 2020	Forbrug 2020	Ultimo '20	Total bevilling ultimo 2020	Total forbrug ultimo 2020	Total disponeret	Total forbrug i % af total bevilling
011014	10019	Udvidelse af Landstingssal	- 75	0	- 75	0	- 75	3.379	- 3.454	- 3.455	-102%
011014	10053	Ny bygning til Inatsisatut	1.490	0	1.490	- 1	1.489	3.000	- 1.511	- 1.877	-50%
011014	Total		1.415	0	1.415	- 1	1.414	6.379	- 4.965	- 5.332	-78%
011015	10049	22 mindre boliger til Inatsisartut	1.941	0	1.941	- 5	1.936	6.000	- 4.064	- 4.275	-68%
011015	Total		1.941	0	1.941	- 5	1.936	6.000	- 4.064	- 4.275	-68%
800010	80801	Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden	2.513	0	2.513	0	2.513	0	2.513	0	-
800010	Total		2.513	0	2.513	0	2.513	0	2.513	0	-
800080	80802	Disp. til påpg.projekteringer	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0%
800080	Total		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0%
822002	90022	Pisariillisaaneq-projektet, ERP	- 1.989	18.200	16.211	- 12.182	4.030	75.942	- 71.912	- 55.813	-80%
822002	Total		- 1.989	18.200	16.211	- 12.182	4.030	75.942	- 71.912	- 55.813	-80%
822003	40089	Fælles kommunalt ESDH-system til socialområdet	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0%
822003	Total		0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0%
822401	90024	Administrative systemer mv. i Skattestyrelse	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	0	0%
822401	Total		0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	0	0%
822402	25192	Krops- og narkoskannere	0	0	0	0	0	0	0	- 1.975	-
822402	Total		0	0	0	0	0	0	0	- 1.975	-
833012	44044	Renovering og tilbygn. alderdomshjem, Nanortalik	0	0	0	1.742	1.742	13.575	- 11.833	- 13.581	-87%

Finanslo v	Projekt dimension	Projekt titel	Primo 2020	Bevilling 2020	Disponibel 2020	Forbrug 2020	Ultimo '20	Total bevilling ultimo 2020	Total forbrug ultimo 2020	Total disponeret	Total forbrug i % af total bevilling
833012	44047	Alderdomshjem i Paamiut	5.437	0	5.437	- 3.207	2.230	27.500	- 25.270	- 27.506	-92%
833012	44048	Pulje til nyanlæg og renovering	14.700	- 11.400	3.300	0	3.300	3.300	0	0	0%
833012	44049	Tilstandsregistrering af ældreområdet	1.435	- 1.400	35	- 98	- 63	3.600	- 3.663	- 3.832	-102%
833012	44051	Renovering/nybygning alderdomshjem, Narsaq	1.000	3.950	4.950	- 6.013	- 1.063	4.950	- 6.013	- 16.361	-121%
833012	44053	Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik	18.000	0	18.000	- 6	17.994	18.000	- 6	- 6	0%
833012	44054	Udvidelse af alderdomshjem, Aasiaat	8.900	7.500	16.400	- 7.391	9.009	16.400	- 7.391	- 16.406	-45%
833012	Total		49.472	- 1.350	48.122	- 14.973	33.149	87.325	- 54.176	- 77.692	-62%
833013	40054	Landsdækkende handicap træningscenter	2.125	0	2.125	- 887	1.237	56.269	- 55.032	- 56.354	-98%
833013	40058	Handicapinstitution Elisaibannguaq, Maniitsoq	582	0	582	- 335	247	7.600	- 7.353	- 7.226	-97%
833013	40062	Udredningshjem	11.001	- 10.000	1.001	- 127	874	8.400	- 7.526	- 7.905	-90%
833013	40063	Misbrugsbehandlingshjem	2	0	2	0	2	20	- 18	- 100	-90%
833013	40064	Hus til ungdomsafdeling i Inn. Inaat	57	0	57	- 21	35	3.300	- 3.265	- 3.393	-99%
833013	40066	Opdeling af Aaqa i to institutioner	2.000	0	2.000	- 11	1.989	2.000	- 11	- 11	-1%
833013	40067	Pulje til nyanlæg og renovering	57.195	- 3.100	54.095	- 6	54.089	54.120	- 31	- 31	0%
833013	40068	Oprettelse af familie/krisecenter, Tasiilaq	278	0	278	- 1	277	2.500	- 2.223	- 2.501	-89%
833013	40075	Lukket gårdmiljø til Isikkivik	819	0	819	- 1	818	830	- 12	- 12	-1%
833013	40077	Handicapinstitution Sungiusarfik Ikinngut	8.252	29.400	37.652	- 22.619	15.035	44.220	- 29.185	- 51.812	-66%
833013	40079	Sikret institution	6.000	- 6.000	0	0	0	0	0	0	-
833013	40081	Satellitafdeling til Meeqqat Illuat, Nuuk	- 1	0	- 1	- 11	- 12	40	- 52	- 52	-130%
833013	40084	Genopførelse af udslusninghjem, Uummannaq	- 2.464	5.315	2.851	3.750	6.601	5.315	1.286	- 6.528	24%
833013	40085	Genopretning af brandskade, Uummannaq	- 1.534	0	- 1.534	0	- 1.534	0	- 1.534	- 1.010	-
833013	40086	Døgninstitution for børn med sindslidelser	0	6.000	6.000	- 32	5.968	6.000	- 32	0	-1%
833013	40087	Institution for børn og voksne med multihandicap	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0%

Finanslo v	Projekt dimension	Projekt titel	Primo 2020	Bevilling 2020	Disponibel 2020	Forbrug 2020	Ultimo '20	Total bevilling ultimo 2020	Total forbrug ultimo 2020	Total disponeret	Total forbrug i % af total bevilling
833013	40090	Etablering af satellitafdeling til Pilutaq	0	3.000	3.000	- 2.749	251	3.000	- 2.749	- 450	-92%
833013	40091	Najugaqarfik Elisibannguaq-nybyg og renovering	0	6.900	6.900	- 296	6.604	6.900	- 296	- 3.500	-4%
833013	Total		84.312	37.515	121.827	- 23.346	98.481	206.514	- 108.033	- 140.885	-52%
844009	51010	Entreprenør og bjergværksskole, Sisim	0	0	0	0	0	52.200	- 52.200	- 52.200	-100%
844009	51013	Udvidelse INUILI, Narsaq	- 209	0	- 209	0	- 209	61.400	- 61.609	- 61.033	-100%
844009	Total		- 209	0	- 209	0	- 209	113.600	- 113.809	- 113.233	-100%
844010	50069	Ren/ombygn.udv. skole Qaqortoq	936	0	936	0	936	115.700	- 114.764	- 116.400	-99%
844010	50091	Skolen Aappilattoq	312	0	312	- 248	65	18.150	- 18.085	- 18.260	-100%
844010	50111	Ren./ombygn./udv. skole, Sarfannguit	514	0	514	0	514	9.500	- 8.986	- 9.517	-95%
844010	50115	Ren./ombygn./udv. skole, Nuussuaq	770	0	770	0	770	9.800	- 9.030	- 15.444	-92%
844010	50126	Udv./ren./ombyg. af skole, Upv. Kujalleq	2.641	0	2.641	- 11	2.630	13.700	- 11.070	- 11.314	-81%
844010	50131	Ny skole i Ilulissat	10.721	- 10.500	221	- 19	202	192.655	- 192.453	- 195.266	-100%
844010	50132	Diverse skole, nyanlæg og renovering	44.797	- 52.000	- 7.203	- 51	- 7.254	- 1.050	- 6.204	- 6.595	591%
844010	50133	Bygdeskole, Alluitsup Paa	6.375	- 7.800	- 1.425	- 84	- 1.510	27.850	- 29.360	- 29.818	-105%
844010	50143	Ren/ombygn. af skolen, Kangaatsiaq	950	0	950	- 950	0	13.950	- 13.950	- 13.000	-100%
844010	Total		68.016	- 70.300	- 2.284	- 1.363	- 3.647	400.255	- 403.902	- 415.614	-101%
844012	51021	Projektplan for udflytning af udd. inst.	9	0	9	- 338	- 329	2.500	- 2.829	- 3.076	-113%
844012	51024	Uddannelsesbyggeri til projektering af ny Jern- og Metalskol	10.000	0	10.000	- 52	9.948	10.000	- 52	- 22	-1%
844012	51026	Landbrugsskole i Upernaviarsuk	0	3.000	3.000	- 54	2.946	3.000	- 54	- 53	-2%
844012	52061	Udvidelse af GU, Aasiaat	- 183	0	- 183	0	- 183	89.400	- 89.583	- 89.583	-100%
844012	52085	Renov. af udd. bygnigner Qeq. kommunia	- 21	0	- 21	- 41	- 62	309	- 371	- 330	-120%
844012	52086	Udvidelse af PISPS, Ilulissat	- 813	0	- 813	- 3	- 815	44.344	- 45.159	- 45.157	-102%
844012	52087	Erstatningsbyggeri for NI+GU, Qaoqrotq	471	0	471	- 1	470	104.400	- 103.930	- 104.385	-100%
844012	52088	Erstatningsbyggeri for Ledelsesakademi, Nuuk	- 551	0	- 551	0	- 551	12.500	- 13.051	- 13.051	-104%

Finanslo v	Projekt dimension	Projekt titel	Primo 2020	Bevilling 2020	Disponibel 2020	Forbrug 2020	Ultimo '20	Total bevilling ultimo 2020	Total forbrug ultimo 2020	Total disponeret	Total forbrug i % af total bevilling
844012	52094	Renovering af Knud Rasmussenip Højskolia	- 1.650	0	- 1.650	- 427	- 2.079	19.691	- 21.770	- 22.467	-111%
844012	52095	Skolepraktikhaller og haller til ko	15.490	0	15.490	- 14.278	1.212	36.500	- 35.288	- 35.118	-97%
844012	52099	Køb af fast ejendom til Vejlednings- psyk.- soc.råd	0	0	0	0	0	4.133	- 4.133	- 5.000	-100%
844012											
Total			22.752	3.000	25.752	- 15.194	10.557	326.777	- 316.220	- 318.242	-97%
844014	54007	Tilskud til renovering af idrætshaller	7.499	- 600	6.899	- 4.681	2.218	14.400	- 12.182	- 12.735	-85%
844014	54008	Projektering af kunstgræsbaner, 2017	600	- 600	0	- 1	- 1	0	- 1	- 1	-
844014											
Total			8.099	- 1.200	6.899	- 4.682	2.217	14.400	- 12.183	- 12.736	-85%
844015	52071	Skolehjem med 50 værelser , Uummanaq	- 474	0	- 474	0	- 474	32.000	- 32.474	- 32.474	-101%
844015	52092	Etablering/renovering elevhjem Qassarsuk	1.826	16.700	18.526	- 12.303	6.224	20.700	- 14.476	- 17.171	-70%
844015	52101	Projektering af standardkollegier, 2015	- 304	0	- 304	0	- 304	2.078	- 2.382	- 2.382	-115%
844015	52102	Projektering af standardkollegier, 2016	136	0	136	- 3	133	3.000	- 2.867	- 2.938	-96%
844015	52103	Projektering af standardkollegier, 2017	994	- 900	94	- 80	14	2.100	- 2.086	- 2.127	-99%
844015	52104	Diverse kollegieprojekter	81.550	- 81.550	0	- 10.559	- 10.559	0	- 10.559	- 10.406	-
844015	52111	32 sengepladser, Aasiaat	2.408	29.300	31.708	- 619	31.089	31.800	- 711	- 3.663	-2%
844015	52112	70 sengepladser, Ilulissat	4.396	30.100	34.496	- 563	33.933	34.600	- 667	- 4.110	-2%
844015	52113	72 sengepladser, Sisimiut	4.428	45.500	49.928	- 627	49.301	50.050	- 749	- 4.457	-1%
844015	52114	218 sengepladser, Nuuk	14.669	100.000	114.669	- 682	113.987	119.500	- 5.513	- 20.295	-5%
844015	52115	74 sengepladser, Qaqortoq	4.596	37.150	41.746	- 617	41.129	41.850	- 721	- 4.282	-2%
844015	52117	Renovering af kollegier, Paamiut	4.968	- 5.000	- 32	0	- 32	0	- 32	- 32	-
844015											
Total			119.193	171.300	290.493	- 26.053	264.441	337.678	- 73.237	- 104.337	-22%
844016	56003	Ny KNR	- 250	0	- 250	0	- 250	12.120	- 12.370	- 12.402	-102%
844016											
Total			- 250	0	- 250	0	- 250	12.120	- 12.370	- 12.402	-102%
844017	41048	Pulje til etablering af daginstitutioner	18.000	- 18.000	0	- 2	- 2	0	- 2	- 2	-

Finanslo v	Projekt dimension	Projekt titel	Primo 2020	Bevilling 2020	Disponibel 2020	Forbrug 2020	Ultimo '20	Total bevilling ultimo 2020	Total forbrug ultimo 2020	Total disponeret	Total forbrug i % af total bevilling
844017	41050	Daginstitution i Atammik, 2015	187	0	187	0	187	2.400	- 2.213	- 2.400	-92%
844017											
Total			18.187	- 18.000	187	- 2	185	2.400	- 2.215	- 2.402	-92%
844501	58041	Renovering af kirke, Ittoqqortoormiit	476	0	476	0	476	1.455	- 979	- 1.069	-67%
844501	58046	Genopførelse, Kirken i Nuussuaq	- 374	0	- 374	0	- 374	0	- 374	- 374	-
844501											
Total			102	0	102	0	102	1.455	- 1.353	- 1.443	-93%
855020	72003	Is-fjordscenteret, Ilulissat	5.000	0	5.000	0	5.000	15.000	- 10.000	- 10.000	-67%
855020	72004	Etablering af Visitorcentre	20.500	- 10.200	10.300	0	10.300	10.300	0	0	0%
855020	72010	Nuuk Natur- og geopark	0	4.750	4.750	0	4.750	4.750	0	0	0%
855020	72011	Nationale seværdigheder	0	- 4.650	- 4.650	0	- 4.650	- 4.650	0	0	0%
855020											
Total			25.500	- 10.100	15.400	0	15.400	25.400	- 10.000	- 10.000	-39%
866001	46009	Laboratorium/DIH, Nuuk	18	0	18	0	18	0	18	0	-
866001	46015	DIH 3. fløj, Nuuk	- 3	0	- 3	0	- 3	33.887	- 33.890	- 33.928	-100%
866001	46017	Patienthotel, Nuuk	- 2	0	- 2	0	- 2	66.522	- 66.524	- 66.524	-100%
866001	46019	Elektronisk Patient Journal	0	0	0	0	0	33.500	- 33.500	- 33.500	-100%
866001	46020	Nedrivning af gammel operationsbygning	0	0	0	0	0	4.500	- 4.500	- 4.500	-100%
866001	46021	Psykiatribygning i Nuuk	- 7.453	7.000	- 453	- 5.531	- 5.982	15.000	- 20.982	- 29.545	-140%
866001	46023	Energioptimering DIH, Nuuk	2.581	0	2.581	- 1.311	1.270	7.000	- 5.730	- 7.451	-82%
866001	46026	Allorfik, lokale misbrugsbehandlingscenter	143	- 100	43	0	43	1.900	- 1.857	- 1.857	-98%
866001	46027	Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Sisimiut	222	0	222	- 1	221	2.500	- 2.279	- 4.461	-91%
866001	46028	Patienthotel i Aasiaat	4.248	- 4.383	- 135	- 893	- 1.026	16.911	- 17.937	- 33.319	-106%
866001	46029	Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Aasiaat	2.500	0	2.500	- 2.219	281	2.500	- 2.219	- 2.500	-89%
866001	46030	Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Ilulissat	983	0	983	- 1	982	3.000	- 2.018	- 2.017	-67%
866001	46031	Projektering af ny sengefløj og patienthotel	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0%

Finanslo v	Projekt dimension	Projekt titel	Primo 2020	Bevilling 2020	Disponibel 2020	Forbrug 2020	Ultimo '20	Total bevilling ultimo 2020	Total forbrug ultimo 2020	Total disponeret	Total forbrug i % af total bevilling
866001	46032	Rømning af byggegrund	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0%
866001	46033	Steno Diabetes Center	0	0	0	1.639	1.639	0	1.639	0	-
866001	47031	Udbygning DIH - fondsmidler	- 1.385	0	- 1.385	- 444	- 1.829	53.428	- 55.257	- 193.660	-103%
866001	47032	Ambulancer	5	0	5	0	5	6.500	- 6.495	- 6.495	-100%
866001	47038	Autoklaver til kystsygehuse	0	0	0	0	0	1.900	- 1.900	- 1.900	-100%
866001	47041	Ilt produktions anlæg i sygehuse	2.830	0	2.830	- 3	2.827	6.500	- 3.673	- 3.673	-57%
866001	47042	Regionssygehus i Sisimiut	0	- 378	- 378	378	0	0	0	- 378	-
866001	47047	Børneafdeling på DIH, Nuuk	300	0	300	0	300	500	- 200	- 202	-40%
866001	47051	Apparaturpuljen	21.725	13.500	35.225	- 14.640	20.585	89.600	- 69.015	- 69.015	-77%
866001	47053	Vedligeholdelseefterslæb	11.193	20.000	31.193	- 21.946	9.247	80.000	- 70.753	- 70.753	-88%
866001	47055	Diverse nyanlæg og renovering	73.928	36.000	109.928	- 74	109.854	110.000	- 146	- 149	0%
866001	48013	Centralklinik i Nuuk	3.514	- 3.500	14	- 4	10	2.218	- 2.208	- 3.331	-100%
866001											
Total			115.347	72.139	187.486	- 45.050	142.440	541.866	- 399.426	- 569.158	-74%
870088	29107	Vej i Sydgrønland	1.842	0	1.842	- 20	1.821	29.825	- 28.004	- 28.092	-94%
870088	29108	Vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0%
870088											
Total			1.842	5.000	6.842	- 20	6.821	34.825	- 28.004	- 28.092	-80%
871106	73014	5-års eftersyn, 2019	177	0	177	126	304	500	- 196	70	-39%
871106	73015	5-års eftersyn, 2020	0	500	500	- 280	220	500	- 280	- 243	-56%
871106											
Total			177	500	677	- 154	524	1.000	- 476	- 173	-48%
871109	23004	Transportkommissionen - forundersøgelser	30.001	11.000	41.001	- 2.805	38.196	82.153	- 43.957	- 61.481	-54%
871109											
Total			30.001	11.000	41.001	- 2.805	38.196	82.153	- 43.957	- 61.481	-54%
877002	10048	Køb af B-1802, KANUKOKA	0	0	0	0	0	20.075	- 20.075	- 20.075	-100%
877002	10052	Køb af B-3953 "Forfatningskommissionen"	0	0	0	0	0	6.995	- 6.995	- 6.995	-100%

Finanslo v	Projekt dimension	Projekt titel	Primo 2020	Bevilling 2020	Disponibel 2020	Forbrug 2020	Ultimo '20	Total bevilling ultimo 2020	Total forbrug ultimo 2020	Total disponeret	Total forbrug i % af total bevilling
877002											
Total			0	0	0	0	0	27.070	- 27.070	- 27.070	-100%
877210	30012	Personaleboliger i Nuuk	7.812	2.000	9.812	- 162	9.650	18.500	- 8.850	- 9.512	-48%
877210											
Total			7.812	2.000	9.812	- 162	9.650	18.500	- 8.850	- 9.512	-48%
877213	97085	Renovering B-294, B-295	0	0	0	0	0	9.454	- 9.454	- 9.454	-100%
877213	97150	Renovering diverse steder, 2009	- 4	0	- 4	0	- 4	18.432	- 18.436	- 15.926	-100%
877213	97151	Renovering diverse steder, 2010	0	0	0	0	0	3.337	- 3.337	- 3.337	-100%
877213	97157	Bevaringsværdige bygninger i Nuuk	4.484	- 4.400	84	- 3	82	11.000	- 10.918	- 11.081	-99%
877213											
Total			4.480	- 4.400	80	- 3	78	42.223	- 42.145	- 39.798	-100%
877221	32066	Støttet kom. udl.byggeri, 2006	0	0	0	0	0	21.366	- 21.366	- 21.366	-100%
877221	32067	Støttet kom. udl.byggeri, 2007	- 1	0	- 1	0	- 1	36.573	- 36.574	- 36.574	-100%
877221	32068	Støttet kom. udl.byggeri, 2008	0	0	0	0	0	44.513	- 44.513	- 44.513	-100%
877221	32090	Støttet kom. udl.byggeri, 2009	- 1.555	0	- 1.555	0	- 1.555	69.800	- 71.355	- 71.355	-102%
877221											
Total			- 1.556	0	- 1.556	0	- 1.556	172.252	- 173.808	- 173.808	-101%
877222	35025	Boligprg.f/bygder og yderd. 2015	1.543	- 2.100	- 557	- 151	- 707	8.400	- 9.107	- 9.131	-108%
877222	35026	Boligprg.f/bygder og yderd. 2016	- 6.236	- 18	- 6.254	6.254	0	0	0	- 6.273	-
877222	36106	Udvikling og afprøvning af Illorput 2100	65	0	65	- 218	- 153	2.480	- 2.633	- 2.473	-106%
877222	39039	Aktivitetshus til Kullorsuaq	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0%
877222											
Total			- 1.128	- 2.118	- 3.246	5.885	2.640	14.380	- 11.740	- 17.877	-82%
877310	24111	Ekstra renovering og istandsættelse 2014	2.737	0	2.737	0	2.737	8.700	- 5.963	- 8.707	-69%
877310	24112	Sektorplan for havne, 2015	2.043	0	2.043	0	2.043	2.500	- 457	- 458	-18%
877310	24114	Sektorplan for havne, 2017	1.000	- 1.000	0	0	0	0	0	0	-
877310											
Total			5.780	- 1.000	4.780	0	4.780	11.200	- 6.420	- 9.165	-57%
877312	24116	Reinvestering i havne og kajanlæg	- 202	25.200	24.998	- 21.584	3.413	144.669	- 141.256	- 153.870	-98%
877312	24122	Sektorplaner for havne	4.964	- 1.300	3.664	- 64	3.600	3.700	- 100	- 45	-3%

Finanslo v	Projekt dimension	Projekt titel	Primo 2020	Bevilling 2020	Disponibel 2020	Forbrug 2020	Ultimo '20	Total bevilling ultimo 2020	Total forbrug ultimo 2020	Total disponeret	Total forbrug i % af total bevilling
877312	24128	Diverse nyanlæg	23.597	- 22.100	1.497	- 179	1.318	1.522	- 204	- 25	-13%
877312	24129	Havn i Kangerlussuaq	3.948	0	3.948	- 54	3.894	4.000	- 106	- 149	-3%
877312	24130	Læmole i Qaanaaq	3.803	0	3.803	- 3.894	- 90	33.000	- 33.090	- 33.570	-100%
877312	24131	Havnefaciliteter i Uummannaq	163	33.100	33.263	- 20.946	12.317	34.100	- 21.783	- 31.610	-64%
877312	24136	Etablering af anløbsfacilitetter	0	4.150	4.150	- 667	3.483	4.150	- 667	0	-16%
877312 Total			36.273	39.050	75.323	- 47.388	27.935	225.141	- 197.206	- 219.269	-88%
877320	25194	Tasiilaq	1.500	0	1.500	- 17	1.483	1.500	- 17	- 5	-1%
877320	25195	Ittoqqortoormiit	1.500	0	1.500	- 17	1.483	1.500	- 17	- 5	-1%
877320	25196	Qeqertarsuaq	1.500	0	1.500	- 17	1.483	1.500	- 17	- 11	-1%
877320	25197	Kangaatsiaq	1.500	0	1.500	- 17	1.483	1.500	- 17	- 11	-1%
877320	25198	Qasigiannuit	1.500	0	1.500	- 17	1.483	1.500	- 17	- 11	-1%
877320	25199	Narsaq	0	1.000	1.000	- 9	991	1.000	- 9	- 3	-1%
877320	25200	Nanortalik	0	1.000	1.000	- 15	985	1.000	- 15	- 9	-2%
877320	25201	Kangerlussuaq	1.000	0	1.000	- 1	999	1.000	- 1	- 1	0%
877320	25204	Uummannaq, landingsbane	0	1.000	1.000	- 6	994	1.000	- 6	0	-1%
877320 Total			8.500	3.000	11.500	- 116	11.384	11.500	- 116	- 56	-1%
877322	20039	Lovliggørelse af elforsyning	0	0	0	0	0	5.775	- 5.775	- 6.000	-100%
877322	25038	Radiofy, renovering	828	0	828	0	828	0	828	0	-
877322	25182	Udvidelse af terminalbygning, Kangerlussuaq	425	- 400	25	- 413	- 387	24.957	- 25.344	- 25.076	-102%
877322	25183	Langsigtede investeringsbehov	3.855	10.000	13.855	- 11.157	2.698	30.000	- 27.302	- 20.035	-91%
877322	25186	Udbedring skimmelsvamp angreb, Sisimiut	0	0	0	0	0	1.710	- 1.710	0	-100%
877322	25188	Ekstra renovering og istandsættelse 2014	- 849	800	- 49	0	- 49	18.100	- 18.149	- 18.149	-100%
877322	25190	Rullende materiel	0	0	0	0	0	0	0	- 12.900	-
877322	25191	Tilstandsregistrering af heliportbygninger	2.900	- 2.900	0	- 14	- 14	100	- 114	- 114	-114%
877322	25193	Vej til lufthavn i Qaanaaq	1.206	0	1.206	- 6	1.200	4.500	- 3.300	- 4.097	-73%

Finanslo v	Projekt dimension	Projekt titel	Primo 2020	Bevilling 2020	Disponibel 2020	Forbrug 2020	Ultimo '20	Total bevilling ultimo 2020	Total forbrug ultimo 2020	Total disponeret	Total forbrug i % af total bevilling
877322	25203	Sikkerhedsudstyr til lufthavne	614	- 600	14	- 3	11	10.200	- 10.189	- 18.745	-100%
877322	25206	Rullende materiel	11.100	0	11.100	- 1.116	9.984	11.100	- 1.116	0	-10%
877322	25207	Helikopterflyvepladser	5.000	0	5.000	- 5.251	- 251	5.000	- 5.251	0	-105%
877322	25208	Vejrobservationstjeneste til lufthavne	3.900	0	3.900	- 991	2.909	3.900	- 991	- 396	-25%
877322	25212	Slidlagsbelægning, Qaarsut landingsbane	0	5.900	5.900	- 6.804	- 904	5.900	- 6.804	- 5.900	-115%
877322	25213	Hangar til helikopter	0	26.000	26.000	- 16.870	9.130	26.000	- 16.870	0	-65%
877322	25938	TD:Radiofyr, renovering	2.796	- 2.800	- 4	- 14	- 18	6.500	- 6.518	- 9.800	-100%
877322	Total		31.775	36.000	67.775	- 42.639	25.137	153.742	- 128.605	- 121.212	-84%
877501	61003	Nyt skib til Pinngortaleriffik	83.228	47.000	130.228	- 88.395	41.833	220.000	- 178.167	- 101.496	-81%
877501	Total		83.228	47.000	130.228	- 88.395	41.833	220.000	- 178.167	- 101.496	-81%
877502	74002	Miljøafbødende foranstaltninger, Dundas	1	0	1	0	1	- 13.742	13.743	13.743	-100%
877502	Total		1	0	1	0	1	- 13.742	13.743	13.743	-100%
877503	74005	Tilskud til kommunale miljøanlæg	4.542	0	4.542	- 2.104	2.438	44.500	- 42.062	- 44.405	-95%
877503	Total		4.542	0	4.542	- 2.104	2.438	44.500	- 42.062	- 44.405	-95%
897140	15004	Udvidelse Qorlortorsuaq	144.000	- 144.000	0	0	0	0	0	0	-
897140	17772	Vandbehandlingsanlæg	12.600	0	12.600	- 12.600	0	12.600	- 12.600	- 12.600	-100%
897140	17773	Udlån til Nukissiorfiit, 2016	76.000	- 68.600	7.400	- 7.400	0	7.400	- 7.400	- 7.400	-100%
897140	17774	Udlån til Nukissiorfiit, 2017	50.000	- 50.000	0	0	0	60.000	- 60.000	0	-100%
897140	17775	Udlån til Nukissiorfiit, 2018	0	0	0	0	0	78.400	- 78.400	- 78.400	-100%
897140	17777	Udlån til Nukissiorfiit, 2020	0	60.000	60.000	- 60.000	0	60.000	-60.000	-60.000	100%
897140	21077	Etabl. af vandkraftværk i Kulusuk	0	18.100	18.100	- 18.100	0	18.100	- 18.100	- 18.100	-100%
897140	Total		282.600	- 184.500	98.100	- 98.100	0	236.500	- 176.500	- 116.500	-75%
897141	28028	Anlægsudlån, byggemodning, Nukissiorfiit, 2013	0	0	0	0	0	6.500	- 6.500	- 6.500	-100%
897141	28029	Særlige byggemodning i Qinngorput	18.600	- 18.600	0	0	0	95.400	- 95.400	0	-100%

Finanslo v	Projekt dimension	Projektitel	Primo 2020	Bevilling 2020	Disponibel 2020	Forbrug 2020	Ultimo '20	Total bevilling ultimo 2020	Total forbrug ultimo 2020	Total disponeret	Total forbrug i % af total bevilling
897141	28033	Anlægsudlån, byggemodning, Nukissiorfiit 2016	15.000	- 15.000	0	0	0	0	0	0	-
897141	28034	Anlægsudlån, byggemodning, Nukissiorfiit 2017	15.000	- 15.000	0	0	0	0	0	0	-
897141											
Total			48.600	- 48.600	0	0	0	101.900	- 101.900	- 6.500	-100%
897212	30014	Alsidge boliger 2015, Qaqortoq	- 151	0	- 151	0	- 151	27.800	- 27.951	- 28.158	-101%
897212	30015	Alsidge boliger 2015, Maniitsoq	- 210	0	- 210	- 10	- 220	46.600	- 46.820	- 47.364	-100%
897212	30016	Bæredygtige boliger 2016, Qaqortoq	- 2	0	- 2	2	0	0	0	- 2	-
897212	30017	Bæredygtige boliger 2016, Sisimiut	7.174	12.200	19.374	- 17.331	2.043	76.710	- 74.667	- 67.891	-97%
897212	30019	Funktionelle boliger, Ilulissat	9.653	13.000	22.653	- 12.249	10.405	28.000	- 17.595	- 32.729	-63%
897212	30025	Nye boliger 2019, Qaqortoq	2.685	5.300	7.985	- 8.370	- 385	8.300	- 8.685	- 27.812	-105%
897212	30026	Nye boliger 2019, Aasiaat	2.583	- 1.400	1.183	- 504	678	1.600	- 922	- 1.507	-58%
897212	30028	Legeplads til skolen, Nuussuaq (UPV)	0	1.200	1.200	- 701	499	1.200	- 701	- 696	-58%
897212	31029	Ekstra renovering og istandsættelse 2014	4.285	0	4.285	- 674	3.611	40.000	- 36.389	- 36.661	-91%
897212	31030	Diverse nedrivning Qaqortoq	4.177	8.200	12.377	- 243	12.134	20.300	- 8.166	- 8.050	-40%
897212	31031	Diverse nedrivning Narsaq	3.553	4.000	7.553	- 2.234	5.318	16.000	- 10.682	- 11.081	-67%
897212	31032	Diverse nedrivning Paamiut	5.629	4.500	10.129	- 1.197	8.933	25.000	- 16.067	- 16.146	-64%
897212	31033	Diverse nedrivning Nuuk	- 6.888	7.300	412	- 287	123	12.300	- 12.177	- 15.460	-99%
897212	31034	Diverse nedrivning Maniitsoq	4.178	0	4.178	- 8	4.170	16.500	- 12.330	- 12.330	-75%
897212	31035	Diverse nedrivning Sisimiut	6.174	0	6.174	- 2.987	3.186	10.000	- 6.814	- 7.740	-68%
897212	31036	Diverse nedrivning Aasiaat	539	500	1.039	- 21	1.018	2.794	- 1.776	- 1.983	-64%
897212	31037	Skimmel renovering	16.408	9.200	25.608	- 10.235	15.373	49.200	- 33.827	- 37.075	-69%
897212	31040	Diverse nedrivning Nanortalik	2.521	0	2.521	- 1.750	771	3.500	- 2.729	- 2.644	-78%
897212	31042	Diverse nedrivning Qasigiannuguit	6.078	500	6.578	- 3.177	3.401	7.000	- 3.599	- 3.536	-51%
897212	31043	Landsdækkende skimmelrenovering	19.032	1.000	20.032	- 12.982	7.052	29.500	- 22.448	- 25.525	-76%
897212	31045	Diverse nedrivning Ilulissat	1.500	200	1.700	- 2	1.698	1.700	- 2	- 2	0%
897212	31046	Renovering af boliger, Aasiaat	81	0	81	- 258	- 177	12.706	- 12.883	- 12.802	-101%

Finanslo v	Projekt dimension	Projekt titel	Primo 2020	Bevilling 2020	Disponibel 2020	Forbrug 2020	Ultimo '20	Total bevilling ultimo 2020	Total forbrug ultimo 2020	Total disponeret	Total forbrug i % af total bevilling
897212	31048	Renovering af altangange og altaner, Nuuk	19.454	0	19.454	- 535	18.919	96.100	- 77.181	- 81.593	-80%
897212	31049	Renovering af Centerbebyggelsen. Qaqortoq	10.908	- 5.900	5.008	- 4.400	609	11.100	- 10.491	- 11.201	-95%
897212	31050	Renovering af altaner, Qaqortoq	0	16.700	16.700	- 3.801	12.899	16.700	- 3.801	- 14.630	-23%
897212	31051	Renovering af altaner, Paamiut	0	11.400	11.400	- 3.457	7.943	11.400	- 3.457	- 9.613	-30%
897212	31053	Renovering af altaner, Maniitsoq	0	19.800	19.800	- 3.973	15.827	19.800	- 3.973	- 17.066	-20%
897212	31055	Renovering af altaner, Sisimiut	0	15.000	15.000	- 776	14.224	15.000	- 776	- 5.683	-5%
897212	31058	Skimmel renovering, Qaqortoq	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0%
897212	31059	Skimmel renovering, Maniitsoq	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0%
897212	31060	Skimmel renovering, Sisimiut	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0%
897212	31062	Skimmel renovering, Aasiaat	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0%
897212	31063	Skimmel renovering, Ilulissat	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0%
897212	31064	Nedrivning af BSU-huse	0	8.200	8.200	- 43	8.157	8.200	- 43	0	-1%
897212	31065	Renovering af Eqalugalinnguit, Nuuk	0	12.900	12.900	- 61	12.839	12.900	- 61	0	0%
897212	31066	Fornyelse af installationer i flere byer	0	45.200	45.200	0	45.200	45.200	0	0	0%
897212	32124	Boliger	- 7.376	22.300	14.924	- 754	14.171	37.340	- 23.169	- 30.866	-62%
897212	32125	16 handicapvenlige boliger, Maniitsoq 2014	0	0	0	0	0	12.800	- 12.800	- 12.800	-100%
897212	32126	16 handicapvenlige boliger, Sisimiut 2014	- 17	0	- 17	0	- 17	12.800	- 12.817	- 12.817	-100%
897212	32127	12 ældrevenlige boliger, Maniitsoq 2014	- 366	0	- 366	0	- 366	7.900	- 8.266	- 8.266	-105%
897212	32128	12 ældrevenlige boliger, Sisimiut 2014	- 678	0	- 678	0	- 678	7.900	- 8.578	- 8.578	-109%
897212	32129	Inissiat 30-it 2014, Tasiilaq	12.045	0	12.045	- 12	12.033	26.700	- 14.667	- 26.712	-55%
897212	32131	8 boliger, Qaanaaq 2014	78	0	78	- 40	38	11.750	- 11.712	- 12.016	-100%
897212	32133	24 boliger, Ilulissat 2014	17.940	0	17.940	- 18	17.922	18.000	- 78	- 105	0%
897212	32134	4 multifunktionshuse i bygder i Qaasuitsup Kommuni	3.433	- 3.434	- 1	- 3	- 4	20.566	- 20.570	- 21.795	-100%
897212	32137	Projektering af ældrevenlige boliger	3.000	- 3.000	0	- 3	- 3	0	- 3	- 3	-

Finanslo v	Projekt dimension	Projekt titel	Primo 2020	Bevilling 2020	Disponibel 2020	Forbrug 2020	Ultimo '20	Total bevilling ultimo 2020	Total forbrug ultimo 2020	Total disponeret	Total forbrug i % af total bevilling
897212	32139	Tilskud til renovering og sanering af boliger	0	0	0	0	0	4.000	- 4.000	- 4.000	-100%
897212	32140	Ungdomsboliger - typehus	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	0	0%
897212	32141	Ungdomsboliger 2021, Qaanaaq	0	14.600	14.600	- 67	14.533	14.600	- 67	0	0%
897212	34517	Byhuse	1	0	1	0	1	144.002	- 144.001	- 144.001	-100%
897212	34527	Diverse renovering og sanering	26.745	59.300	86.045	- 29.296	56.751	249.755	- 193.004	- 210.905	-77%
897212	34528	Genhusningcenter for lejere i Nuuk	0	0	0	0	0	7.712	- 7.712	- 7.712	-100%
897212	34534	Bæredygtige boliger 2017, Nuuk	- 100	0	- 100	0	- 100	0	- 100	- 100	-
897212	36101	Bygder- og yderdistrikter	- 8	0	- 8	0	- 8	15.000	- 15.008	- 15.008	-100%
897212	38016	Udvikling og afprøvning af lokale byggematerialer	100	0	100	0	100	100	0	0	0%
897212	38017	Udvikling af Illoq Nutaaq	1.335	- 1.300	35	- 133	- 98	700	- 798	- 879	-114%
897212	38018	Forundersøgelser i Qaanaaq	2.035	0	2.035	- 2.189	- 154	2.600	- 2.754	- 843	-106%
897212	39041	Genhusning efter oversvømmelse	- 22.481	0	- 22.481	- 4.654	- 27.134	81.554	- 108.688	- 110.214	-133%
897212	Total		155.047	292.266	447.313	- 129.433	317.884	1.363.689	- 1.045.805	- 1.164.600	-77%
		Afrunding primo	591								
Hovedto tal			1.212.966	414.002	1.626.377	- 548.285	1.078.683	4.922.544	- 3.844.440	- 4.044.310	-77%

Bilag 2: Projektstatus

Projektstadi	Projekt dimension	Projekttitel	Finanslov	Primo 2020	Bevilling 2020	Disponibel 2020	Forbrug 2020	Ultimo '20	Total bevilling ultimo 2020	Total forbrug ultimo 2020	Total disponeret
FFL (ikke aktiv)	17772	Vandbehandlingsanlæg	897140	12.600	0	12.600	0	12.600	12.600	0	0
FFL (ikke aktiv)	28028	Anlægsudlån, byggemodning, Nukissiorfiit, 2013	897141	0	0	0	0	0	6.500	- 6.500	- 6.500
FFL (ikke aktiv) Total				12.600	0	12.600	0	12.600	19.100	- 6.500	- 6.500
Igangværende	10048	Køb af B-1802, KANUKOKA	877002	0	0	0	0	0	20.075	- 20.075	- 20.075
Igangværende	10049	22 mindre boliger til Inatsisartut	011015	1.941	0	1.941	- 5	1.936	6.000	- 4.064	- 4.275
Igangværende	10052	Køb af B-3953 "Forfatningskommissionen"	877002	0	0	0	0	0	6.995	- 6.995	- 6.995
Igangværende	10053	Ny bygning til Inatsisatut	011014	1.490	0	1.490	- 1	1.489	3.000	- 1.511	- 1.877
Igangværende	15004	Udvidelse Qorlortorsuaq	897140	144.000	- 144.000	0	0	0	0	0	0
Igangværende	17772	Vandbehandlingsanlæg	897140	0	0	0	- 12.600	- 12.600	0	- 12.600	- 12.600
Igangværende	17773	Udlån til Nukissiorfiit, 2016	897140	76.000	- 68.600	7.400	- 7.400	0	7.400	- 7.400	- 7.400
Igangværende	17774	Udlån til Nukissiorfiit, 2017	897140	50.000	- 50.000	0	0	0	60.000	- 60.000	0
Igangværende	17775	Udlån til Nukissiorfiit, 2018	897140	0	0	0	0	0	78.400	- 78.400	- 78.400
Igangværende	17777	Udlån til Nukissiorfiit, 2020	897140	0	60.000	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000	-60.000
Igangværende	20039	Lovliggørelse af elforsyning	877322	0	0	0	0	0	5.775	- 5.775	- 6.000
Igangværende	21077	Etabl. af vandkraftværk i Kulusuk	897140	0	18.100	18.100	- 18.100	0	18.100	- 18.100	- 18.100
Igangværende	23004	Transportkommissionen - forundersøgelser	871109	31.999	11.000	42.999	- 2.694	40.305	82.153	- 41.848	- 59.372
Igangværende	24111	Ekstra renovering og istandsættelse 2014	877310	2.737	0	2.737	0	2.737	8.700	- 5.963	- 8.707
Igangværende	24112	Sektorplan for havne, 2015	877310	2.043	0	2.043	0	2.043	2.500	- 457	- 458
Igangværende	24114	Sektorplan for havne, 2017	877310	1.000	- 1.000	0	0	0	0	0	0
Igangværende	24116	Reinvestering i havne og kajanlæg	877312	84.967	25.200	110.167	- 20.978	89.188	144.669	- 55.481	- 68.095
Igangværende	24122	Sektorplaner for havne	877312	4.964	- 1.300	3.664	- 64	3.600	3.700	- 100	- 45
Igangværende	24128	Diverse nyanlæg	877312	23.597	- 22.100	1.497	- 179	1.318	1.522	- 204	- 25
Igangværende	24129	Havn i Kangerlussuaq	877312	3.948	0	3.948	- 54	3.894	4.000	- 106	- 149
Igangværende	24130	Læmole i Qaanaaq	877312	3.803	0	3.803	- 3.894	- 90	33.000	- 33.090	- 33.570
Igangværende	24131	Havnefaciliteter i Uummannaq	877312	163	33.100	33.263	- 20.946	12.317	34.100	- 21.783	- 31.610
Igangværende	24136	Etablering af anløbsfaciliteter	877312	0	4.150	4.150	- 667	3.483	4.150	- 667	0

Igangværende	25038	Radiofyr, renovering	877322	828	0	828	0	828	0	828	0
Igangværende	25182	Udvidelse af terminalbygning, Kangerlussuaq	877322	425	- 400	25	- 413	- 387	24.957	- 25.344	- 25.076
Igangværende	25183	Langsigtede investeringsbehov	877322	3.855	10.000	13.855	- 11.157	2.698	30.000	- 27.302	- 20.035
Igangværende	25186	Udbedring skimmelsvamp angreb, Sisimiut	877322	0	0	0	0	0	1.710	- 1.710	0
Igangværende	25188	Ekstra renovering og istandsættelse 2014	877322	- 849	800	- 49	0	- 49	18.100	- 18.149	- 18.149
Igangværende	25190	Rullende materiel	877322	0	0	0	0	0	0	0	- 12.900
Igangværende	25191	Tilstandsregistrering af heliportbygninger	877322	2.900	- 2.900	0	- 14	- 14	100	- 114	- 114
Igangværende	25192	Krops- og narkoskannere	822402	0	0	0	0	0	0	0	- 1.975
Igangværende	25193	Vej til lufthavn i Qaanaaq	877322	1.206	0	1.206	- 6	1.200	4.500	- 3.300	- 4.097
Igangværende	25194	Tasiilaq	877320	1.500	0	1.500	- 17	1.483	1.500	- 17	- 5
Igangværende	25195	Ittoqqortoormiit	877320	1.500	0	1.500	- 17	1.483	1.500	- 17	- 5
Igangværende	25196	Qeqertarsuaq	877320	1.500	0	1.500	- 17	1.483	1.500	- 17	- 11
Igangværende	25197	Kangaatsiaq	877320	1.500	0	1.500	- 17	1.483	1.500	- 17	- 11
Igangværende	25198	Qasigiannuit	877320	1.500	0	1.500	- 17	1.483	1.500	- 17	- 11
Igangværende	25199	Narsaq	877320	0	1.000	1.000	- 9	991	1.000	- 9	- 3
Igangværende	25200	Nanortalik	877320	0	1.000	1.000	- 15	985	1.000	- 15	- 9
Igangværende	25201	Kangerlussuaq	877320	1.000	0	1.000	- 1	999	1.000	- 1	- 1
Igangværende	25203	Sikkerhedsudstyr til lufthavne	877322	614	- 600	14	- 3	11	10.200	- 10.189	- 18.745
Igangværende	25204	Uummannaq, landingsbane	877320	0	1.000	1.000	- 6	994	1.000	- 6	0
Igangværende	25206	Rullende materiel	877322	11.100	0	11.100	- 1.116	9.984	11.100	- 1.116	0
Igangværende	25207	Helikopterflyvepladser	877322	5.000	0	5.000	- 5.251	- 251	5.000	- 5.251	0
Igangværende	25208	Vejrobservationstjeneste til lufthavne	877322	3.900	0	3.900	- 991	2.909	3.900	- 991	- 396
Igangværende	25212	Slidlagsbelægning, Qaarsut landingsbane	877322	0	5.900	5.900	- 6.804	- 904	5.900	- 6.804	- 5.900
Igangværende	25213	Hangar til helikopter	877322	0	26.000	26.000	- 16.870	9.130	26.000	- 16.870	0
Igangværende	25938	TD:Radiofyr, renovering	877322	2.796	- 2.800	- 4	- 14	- 18	6.500	- 6.518	- 9.800
Igangværende	28029	Særlige byggemodning i Qinngorput	897141	18.600	- 18.600	0	0	0	95.400	- 95.400	0
Igangværende	28033	Anlægsudlån, byggemodning, Nukissiorfiit 2016	897141	15.000	- 15.000	0	0	0	0	0	0
Igangværende	28034	Anlægsudlån, byggemodning, Nukissiorfiit 2017	897141	15.000	- 15.000	0	0	0	0	0	0

Igangværende	29107	Vej i Sydgrønland	870088	1.842	0	1.842	- 20	1.821	29.825	- 28.004	- 28.092
Igangværende	29108	Vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq	870088	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0
Igangværende	30012	Personaleboliger i Nuuk	877210	7.812	2.000	9.812	- 162	9.650	18.500	- 8.850	- 9.512
Igangværende	30014	Alsidige boliger 2015, Qaqortoq	897212	- 151	0	- 151	0	- 151	27.800	- 27.951	- 28.158
Igangværende	30015	Alsidige boliger 2015, Maniitsoq	897212	- 210	0	- 210	- 10	- 220	46.600	- 46.820	- 47.364
Igangværende	30017	Bæredygtige boliger 2016, Sisimiut	897212	7.174	12.200	19.374	- 17.331	2.043	76.710	- 74.667	- 67.891
Igangværende	30019	Funktionelle boliger, Ilulissat	897212	9.653	13.000	22.653	- 12.249	10.405	28.000	- 17.595	- 32.729
Igangværende	30025	Nye boliger 2019, Qaqortoq	897212	2.685	5.300	7.985	- 8.370	- 385	8.300	- 8.685	- 27.812
Igangværende	30026	Nye boliger 2019, Aasiaat	897212	2.998	- 1.400	1.598	- 192	1.405	1.600	- 195	- 142
Igangværende	30028	Legeplads til skolen, Nuussuaq (UPV)	897212	0	1.200	1.200	- 701	499	1.200	- 701	- 696
Igangværende	31029	Ekstra renovering og istandsættelse 2014	897212	4.285	0	4.285	- 674	3.611	40.000	- 36.389	- 36.661
Igangværende	31030	Diverse nedrivning Qaqortoq	897212	4.177	8.200	12.377	- 243	12.134	20.300	- 8.166	- 8.050
Igangværende	31031	Diverse nedrivning Narsaq	897212	3.553	4.000	7.553	- 2.234	5.318	16.000	- 10.682	- 11.081
Igangværende	31032	Diverse nedrivning Paamiut	897212	5.629	4.500	10.129	- 1.197	8.933	25.000	- 16.067	- 16.146
Igangværende	31033	Diverse nedrivning Nuuk	897212	- 6.888	7.300	412	- 287	123	12.300	- 12.177	- 15.460
Igangværende	31034	Diverse nedrivning Maniitsoq	897212	4.178	0	4.178	- 8	4.170	16.500	- 12.330	- 12.330
Igangværende	31035	Diverse nedrivning Sisimiut	897212	6.174	0	6.174	- 2.987	3.186	10.000	- 6.814	- 7.740
Igangværende	31036	Diverse nedrivning Aasiaat	897212	539	500	1.039	- 21	1.018	2.794	- 1.776	- 1.983
Igangværende	31037	Skimmel renovering	897212	16.408	9.200	25.608	- 10.235	15.373	49.200	- 33.827	- 37.075
Igangværende	31040	Diverse nedrivning Nanortalik	897212	2.521	0	2.521	- 1.750	771	3.500	- 2.729	- 2.644
Igangværende	31042	Diverse nedrivning Qasigianniguit	897212	6.078	500	6.578	- 3.177	3.401	7.000	- 3.599	- 3.536
Igangværende	31043	Landsdækkende skimmelrenovering	897212	19.032	1.000	20.032	- 12.982	7.052	29.500	- 22.448	- 25.525
Igangværende	31045	Diverse nedrivning Ilulissat	897212	1.500	200	1.700	- 2	1.698	1.700	- 2	- 2
Igangværende	31046	Renovering af boliger, Aasiaat	897212	81	0	81	- 258	- 177	12.706	- 12.883	- 12.802
Igangværende	31048	Renovering af altangange og altaner, Nuuk	897212	19.454	0	19.454	- 535	18.919	96.100	- 77.181	- 81.593
Igangværende	31049	Renovering af Centerbebyggelsen, Qaqortoq	897212	10.908	- 5.900	5.008	- 4.400	609	11.100	- 10.491	- 11.201
Igangværende	31050	Renovering af altaner, Qaqortoq	897212	0	16.700	16.700	- 3.801	12.899	16.700	- 3.801	- 14.630
Igangværende	31051	Renovering af altaner, Paamiut	897212	0	11.400	11.400	- 3.457	7.943	11.400	- 3.457	- 9.613
Igangværende	31053	Renovering af altaner, Maniitsoq	897212	0	19.800	19.800	- 3.973	15.827	19.800	- 3.973	- 17.066

Igangværende	31055	Renovering af altaner, Sisimiut	897212	0	15.000	15.000	- 776	14.224	15.000	- 776	- 5.683
Igangværende	31058	Skimmel renovering, Qaqortoq	897212	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0
Igangværende	31059	Skimmel renovering, Maniitsoq	897212	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0
Igangværende	31060	Skimmel renovering, Sisimiut	897212	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0
Igangværende	31062	Skimmel renovering, Aasiaat	897212	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0
Igangværende	31063	Skimmel renovering, Ilulissat	897212	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0
Igangværende	31064	Nedrivning af BSU-huse	897212	0	8.200	8.200	- 43	8.157	8.200	- 43	0
Igangværende	31065	Renovering af Egalugalinnguit, Nuuk	897212	0	12.900	12.900	- 61	12.839	12.900	- 61	0
Igangværende	31066	Fornylse af installationer i flere byer	897212	0	45.200	45.200	0	45.200	45.200	0	0
Igangværende	32066	Støttet kom. udl.byggeri, 2006	877221	0	0	0	0	0	21.366	- 21.366	- 21.366
Igangværende	32067	Støttet kom. udl.byggeri, 2007	877221	- 1	0	- 1	0	- 1	36.573	- 36.574	- 36.574
Igangværende	32068	Støttet kom. udl.byggeri, 2008	877221	0	0	0	0	0	44.513	- 44.513	- 44.513
Igangværende	32090	Støttet kom. udl.byggeri, 2009	877221	- 1.555	0	- 1.555	0	- 1.555	69.800	- 71.355	- 71.355
Igangværende	32124	Boliger	897212	- 7.376	22.300	14.924	- 754	14.171	37.340	- 23.169	- 30.866
Igangværende	32125	16 handicapvenlige boliger, Maniitsoq 2014	897212	0	0	0	0	0	12.800	- 12.800	- 12.800
Igangværende	32126	16 handicapvenlige boliger, Sisimiut 2014	897212	- 17	0	- 17	0	- 17	12.800	- 12.817	- 12.817
Igangværende	32127	12 ældrevenlige boliger, Maniitsoq 2014	897212	- 366	0	- 366	0	- 366	7.900	- 8.266	- 8.266
Igangværende	32128	12 ældrevenlige boliger, Sisimiut 2014	897212	- 678	0	- 678	0	- 678	7.900	- 8.578	- 8.578
Igangværende	32129	Inissiat 30-it 2014, Tasiilaq	897212	12.045	0	12.045	- 12	12.033	26.700	- 14.667	- 26.712
Igangværende	32131	8 boliger, Qaanaaq 2014	897212	78	0	78	- 40	38	11.750	- 11.712	- 12.016
Igangværende	32133	24 boliger, Ilulissat 2014	897212	17.940	0	17.940	- 18	17.922	18.000	- 78	- 105
Igangværende	32134	4 multifunktionshuse i bygder i Qaasuitsup Kommuni	897212	6.293	- 3.434	2.859	- 3	2.856	20.566	- 17.710	- 18.935
Igangværende	32137	Projektering af ældrevenlige boliger	897212	3.000	- 3.000	0	- 3	- 3	0	- 3	- 3
Igangværende	32139	Tilskud til renovering og sanering af boliger	897212	0	0	0	0	0	4.000	- 4.000	- 4.000
Igangværende	32140	Ungdomsboliger - typehus	897212	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	0
Igangværende	32141	Ungdomsboliger 2021, Qaanaaq	897212	0	14.600	14.600	- 67	14.533	14.600	- 67	0
Igangværende	34527	Diverse renovering og sanering	897212	26.745	59.300	86.045	- 29.296	56.751	249.755	- 193.004	- 210.905
Igangværende	38016	Udvikling og afprøvning af lokale byggematerialer	897212	100	0	100	0	100	100	0	0

Igangværende	38018	Forundersøgelser i Qaanaaq	897212	2.035	0	2.035	- 2.189	- 154	2.600	- 2.754	- 843
Igangværende	39039	Aktivitetshus til Kullorsuaq	877222	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	0	0
Igangværende	39041	Genhusning efter oversvømmelse	897212	- 22.481	0	- 22.481	- 4.654	- 27.134	81.554	- 108.688	- 110.214
Igangværende	40054	Landsdækkende handicap træningscenter	833013	2.125	0	2.125	- 887	1.237	56.269	- 55.032	- 56.354
Igangværende	40058	Handicapinstitution Elisibannguaq, Maniitsoq	833013	582	0	582	- 335	247	7.600	- 7.353	- 7.226
Igangværende	40062	Udredningshjem	833013	11.001	- 10.000	1.001	- 127	874	8.400	- 7.526	- 7.905
Igangværende	40063	Misbrugsbehandlingshjem	833013	2	0	2	0	2	20	- 18	- 100
Igangværende	40066	Opdeling af Aaqa i to institutioner	833013	2.000	0	2.000	- 11	1.989	2.000	- 11	- 11
Igangværende	40067	Pulje til nyanlæg og renovering	833013	57.195	- 3.100	54.095	- 6	54.089	54.120	- 31	- 31
Igangværende	40068	Oprettelse af familie/krisecenter, Tasiilaq	833013	278	0	278	- 1	277	2.500	- 2.223	- 2.501
Igangværende	40075	Lukket gårdmiljø til Isikkivik	833013	819	0	819	- 1	818	830	- 12	- 12
Igangværende	40077	Handicapinstitution Sungiusarfik Ikinngut	833013	8.252	29.400	37.652	- 22.619	15.035	44.220	- 29.185	- 51.812
Igangværende	40079	Sikret institution	833013	6.000	- 6.000	0	0	0	0	0	0
Igangværende	40081	Satellitafdeling til Meeqqat Illuat, Nuuk	833013	- 1	0	- 1	- 11	- 12	40	- 52	- 52
Igangværende	40084	Genopførelse af udslusninghjem, Uummanaaq	833013	- 2.464	5.315	2.851	3.750	6.601	5.315	1.286	- 6.528
Igangværende	40086	Døgninstitution for børn med sindslidelser	833013	0	6.000	6.000	- 32	5.968	6.000	- 32	0
Igangværende	40087	Institution for børn og voksne med multihandicap	833013	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0
Igangværende	40089	Fælles kommunalt ESDH-system til socialområdet	822003	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0
Igangværende	40090	Etablering af satellitafdeling til Pilutaq	833013	0	3.000	3.000	- 2.749	251	3.000	- 2.749	- 450
Igangværende	40091	Najugaqarfik Elisibannguaq-nybyg og renovering	833013	0	6.900	6.900	- 296	6.604	6.900	- 296	- 3.500
Igangværende	41048	Pulje til etablering af daginstitutioner	844017	18.000	- 18.000	0	- 2	- 2	0	- 2	- 2
Igangværende	41050	Daginstitution i Atammik, 2015	844017	187	0	187	0	187	2.400	- 2.213	- 2.400
Igangværende	44044	Renovering og tilbygn. alderdomshjem, Nanortalik	833012	0	0	0	1.742	1.742	13.575	- 11.833	- 13.581
Igangværende	44047	Alderdomshjem i Paamiut	833012	5.437	0	5.437	- 3.207	2.230	27.500	- 25.270	- 27.506
Igangværende	44048	Pulje til nyanlæg og renovering	833012	14.700	- 11.400	3.300	0	3.300	3.300	0	0
Igangværende	44049	Tilstandsregistrering af ældreområdet	833012	1.435	- 1.400	35	- 98	- 63	3.600	- 3.663	- 3.832
Igangværende	44051	Renovering/nybygning alderdomshjem, Narsaq	833012	1.000	3.950	4.950	- 6.013	- 1.063	4.950	- 6.013	- 16.361

Igangværende	44053	Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik	833012	18.000	0	18.000	- 6	17.994	18.000	- 6	- 6
Igangværende	44054	Udvidelse af alderdomshjem, Aasiaat	833012	8.900	7.500	16.400	- 7.391	9.009	16.400	- 7.391	- 16.406
Igangværende	46017	Patienthotel, Nuuk	866001	- 2	0	- 2	0	- 2	66.522	- 66.524	- 66.524
Igangværende	46020	Nedrivning af gammel operationsbygning	866001	0	0	0	0	0	4.500	- 4.500	- 4.500
Igangværende	46021	Psykiatribygning i Nuuk	866001	- 7.453	7.000	- 453	- 5.531	- 5.982	15.000	- 20.982	- 29.545
Igangværende	46023	Energioptimering DIH, Nuuk	866001	2.581	0	2.581	- 1.311	1.270	7.000	- 5.730	- 7.451
Igangværende	46026	Allorfik, lokale misbrugsbehandlingscenter	866001	143	- 100	43	0	43	1.900	- 1.857	- 1.857
Igangværende	46027	Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Sisimiut	866001	222	0	222	- 1	221	2.500	- 2.279	- 4.461
Igangværende	46028	Patienthotel i Aasiaat	866001	4.248	- 4.383	- 135	- 893	- 1.026	16.911	- 17.937	- 33.319
Igangværende	46029	Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Aasiaat	866001	2.500	0	2.500	- 2.219	281	2.500	- 2.219	- 2.500
Igangværende	46030	Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Ilulissat	866001	983	0	983	- 1	982	3.000	- 2.018	- 2.017
Igangværende	46031	Projektering af ny sengefløj og patienthotel	866001	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0
Igangværende	46032	Rømning af byggegrund	866001	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0
Igangværende	46033	Steno Diabetes Center	866001	0	0	0	1.639	1.639	0	1.639	0
Igangværende	47031	Udbygning DIH - fondsmidler	866001	- 1.385	0	- 1.385	- 444	- 1.829	53.428	- 55.257	- 193.660
Igangværende	47041	Ilt produktions anlæg i sygehuse	866001	2.830	0	2.830	- 3	2.827	6.500	- 3.673	- 3.673
Igangværende	47042	Regionssygehus i Sisimiut	866001	0	- 378	- 378	378	0	0	0	- 378
Igangværende	47047	Børneafdeling på DIH, Nuuk	866001	300	0	300	0	300	500	- 200	- 202
Igangværende	47051	Apparaturpuljen	866001	21.725	13.500	35.225	- 14.640	20.585	89.600	- 69.015	- 69.015
Igangværende	47053	Vedligeholdelsesefterslæb	866001	11.193	20.000	31.193	- 21.946	9.247	80.000	- 70.753	- 70.753
Igangværende	47055	Diverse nyanlæg og renovering	866001	73.928	36.000	109.928	- 74	109.854	110.000	- 146	- 149
Igangværende	48013	Centralklinik i Nuuk	866001	3.514	- 3.500	14	- 4	10	2.218	- 2.208	- 3.331
Igangværende	50091	Skolen Aappilattoq	844010	312	0	312	- 248	65	18.150	- 18.085	- 18.260
Igangværende	50111	Ren./ombyg./udv. skole, Sarfannguit	844010	514	0	514	0	514	9.500	- 8.986	- 9.517
Igangværende	50115	Ren./ombyg./udv. skole, Nuussuaq	844010	770	0	770	0	770	9.800	- 9.030	- 15.444
Igangværende	50126	Udv./ren./ombyg. af skole, Upv. Kujalleq	844010	2.641	0	2.641	- 11	2.630	13.700	- 11.070	- 11.314
Igangværende	50132	Diverse skole, nyanlæg og renovering	844010	44.797	- 52.000	- 7.203	- 51	- 7.254	- 1.050	- 6.204	- 6.595
Igangværende	50143	Ren/ombyg. af skolen, Kangaatsiaq	844010	950	0	950	- 950	0	13.950	- 13.950	- 13.000
Igangværende	51021	Projektplan for udflytning af udd. inst.	844012	9	0	9	- 338	- 329	2.500	- 2.829	- 3.076

Igangværende	51024	Uddannelsesbyggeri til projektering af ny Jern- og Metalskol	844012	10.000	0	10.000	- 52	9.948	10.000	- 52	- 22
Igangværende	51026	Landbrugsskole i Upernaviarsuk	844012	0	3.000	3.000	- 54	2.946	3.000	- 54	- 53
Igangværende	52086	Udvidelse af PISPS, Ilulissat	844012	- 813	0	- 813	- 3	- 815	44.344	- 45.159	- 45.157
Igangværende	52092	Etablering/renovering elevhjem Qassarsuk	844015	1.826	16.700	18.526	- 12.303	6.224	20.700	- 14.476	- 17.171
Igangværende	52094	Renovering af Knud Rasmussenip Højskolia	844012	- 1.650	0	- 1.650	- 427	- 2.079	19.691	- 21.770	- 22.467
Igangværende	52095	Skolepraktikhaller og haller til ko	844012	15.490	0	15.490	- 14.278	1.212	36.500	- 35.288	- 35.118
Igangværende	52099	Køb af fast ejendom til Vejlednings- psyk.- soc.råd	844012	0	0	0	0	0	4.133	- 4.133	- 5.000
Igangværende	52104	Diverse kollegieprojekter	844015	81.550	- 81.550	0	- 10.559	- 10.559	0	- 10.559	- 10.406
Igangværende	52111	32 sengepladser, Aasiaat	844015	2.408	29.300	31.708	- 619	31.089	31.800	- 711	- 3.663
Igangværende	52112	70 sengepladser, Ilulissat	844015	4.396	30.100	34.496	- 563	33.933	34.600	- 667	- 4.110
Igangværende	52113	72 sengepladser, Sisimiut	844015	4.428	45.500	49.928	- 627	49.301	50.050	- 749	- 4.457
Igangværende	52114	218 sengepladser, Nuuk	844015	14.669	100.000	114.669	- 682	113.987	119.500	- 5.513	- 20.295
Igangværende	52115	74 sengepladser, Qaqortoq	844015	4.596	37.150	41.746	- 617	41.129	41.850	- 721	- 4.282
Igangværende	54007	Tilskud til renovering af idrætshaller	844014	8.111	- 600	7.511	- 1.937	5.574	14.400	- 8.826	- 9.379
Igangværende	56003	Ny KNR	844016	- 250	0	- 250	0	- 250	12.120	- 12.370	- 12.402
Igangværende	58041	Renovering af kirke, Ittoqqortoormiit	844501	476	0	476	0	476	1.455	- 979	- 1.069
Igangværende	58046	Genopførelse, Kirken i Nuussuaq	844501	- 374	0	- 374	0	- 374	0	- 374	- 374
Igangværende	61003	Nyt skib til Pinngortitaleriffik	877501	83.228	47.000	130.228	- 88.395	41.833	220.000	- 178.167	- 101.496
Igangværende	72003	Is-fjordscenteret, Ilulissat	855020	5.000	0	5.000	0	5.000	15.000	- 10.000	- 10.000
Igangværende	72004	Etablering af Visitorcentre	855020	20.500	- 10.200	10.300	0	10.300	10.300	0	0
Igangværende	72010	Nuuk Natur- og geopark	855020	0	4.750	4.750	0	4.750	4.750	0	0
Igangværende	72011	Nationale seværdigheder	855020	0	- 4.650	- 4.650	0	- 4.650	- 4.650	0	0
Igangværende	73014	5-års eftersyn, 2019	871106	177	0	177	126	304	500	- 196	70
Igangværende	73015	5-års eftersyn, 2020	871106	0	500	500	- 280	220	500	- 280	- 243
Igangværende	74005	Tilskud til kommunale miljøanlæg	877503	4.542	0	4.542	- 2.104	2.438	44.500	- 42.062	- 44.405
Igangværende	80801	Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden	800010	2.513	0	2.513	0	2.513	0	2.513	0
Igangværende	80802	Disp. til påpg.projekteringer	800080	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0
Igangværende	90022	Pisariillisaaneq-projektet, ERP	822002	34.159	18.200	52.359	- 12.182	40.177	75.942	- 35.764	- 31.165

Igangværende	90024	Administrative systemer mv. i Skattestyrelse	822401	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	0
Igangværende	97157	Bevaringsværdige bygninger i Nuuk	877213	4.484	- 4.400	84	- 3	82	11.000	- 10.918	- 11.081
Igangværende Total				1.308.455	442.220	1.750.675	- 478.516	1.272.172	3.929.611	- 2.657.439	- 2.848.443
Til intern revision	10019	Udvidelse af Landstingssal	011014	- 75	0	- 75	0	- 75	3.379	- 3.454	- 3.455
Til intern revision	23004	Transportkommissionen - forundersøgelser	871109	- 1.998	0	- 1.998	- 111	- 2.109	0	- 2.109	- 2.109
Til intern revision	24116	Reinvestering i havne og kajanlæg	877312	- 85.169	0	- 85.169	- 606	- 85.775	0	- 85.775	- 85.775
Til intern revision	30016	Bæredygtige boliger 2016, Qaqortoq	897212	- 2	0	- 2	2	0	0	0	- 2
Til intern revision	30026	Nye boliger 2019, Aasiaat	897212	- 415	0	- 415	- 312	- 727	0	- 727	- 1.365
Til intern revision	32134	4 multifunktionshuse i bygder i Qaasuitsup Kommuni	897212	- 2.860	0	- 2.860	0	- 2.860	0	- 2.860	- 2.860
Til intern revision	34517	Byhuse	897212	1	0	1	0	1	144.002	- 144.001	- 144.001
Til intern revision	34528	Genhusningcenter for lejere i Nuuk	897212	0	0	0	0	0	7.712	- 7.712	- 7.712
Til intern revision	34534	Bæredygtige boliger 2017, Nuuk	897212	- 100	0	- 100	0	- 100	0	- 100	- 100
Til intern revision	35025	Boligprg.f/bygder og yderd. 2015	877222	1.543	- 2.100	- 557	- 151	- 707	8.400	- 9.107	- 9.131
Til intern revision	35026	Boligprg.f/bygder og yderd. 2016	877222	- 6.236	- 18	- 6.254	6.254	0	0	0	- 6.273
Til intern revision	36101	Bygder- og yderdistrikter	897212	- 8	0	- 8	0	- 8	15.000	- 15.008	- 15.008
Til intern revision	36106	Udvikling og afprøvning af Illorput 2100	877222	65	0	65	- 218	- 153	2.480	- 2.633	- 2.473
Til intern revision	38017	Udvikling af Illoq Nutaaq	897212	1.335	- 1.300	35	- 133	- 98	700	- 798	- 879
Til intern revision	40064	Hus til ungdomsafdeling i Inn. Inaat	833013	57	0	57	- 21	35	3.300	- 3.265	- 3.393
Til intern revision	40085	Genopretning af brandskade, Uummannaq	833013	- 1.534	0	- 1.534	0	- 1.534	0	- 1.534	- 1.010
Til intern revision	46009	Laboratorium/DIH, Nuuk	866001	18	0	18	0	18	0	18	0
Til intern revision	46015	DIH 3. fløj, Nuuk	866001	- 3	0	- 3	0	- 3	33.887	- 33.890	- 33.928

Til intern revision	46019	Elektronisk Patient Journal	866001	0	0	0	0	0	33.500	- 33.500	- 33.500
Til intern revision	47032	Ambulancer	866001	5	0	5	0	5	6.500	- 6.495	- 6.495
Til intern revision	47038	Autoklaver til kystsygehuse	866001	0	0	0	0	0	1.900	- 1.900	- 1.900
Til intern revision	50069	Ren/ombyggn.udv. skole Qaqortoq	844010	936	0	936	0	936	115.700	- 114.764	- 116.400
Til intern revision	50131	Ny skole i Ilulissat	844010	10.721	- 10.500	221	- 19	202	192.655	- 192.453	- 195.266
Til intern revision	50133	Bygdeskole, Alluitsup Paa	844010	6.375	- 7.800	- 1.425	- 84	- 1.510	27.850	- 29.360	- 29.818
Til intern revision	51010	Entreprenør og bjergværksskole, Sisim	844009	0	0	0	0	0	52.200	- 52.200	- 52.200
Til intern revision	51013	Udvidelse INULLI, Narsaq	844009	- 209	0	- 209	0	- 209	61.400	- 61.609	- 61.033
Til intern revision	52061	Udvidelse af GU, Aasiaat	844012	- 183	0	- 183	0	- 183	89.400	- 89.583	- 89.583
Til intern revision	52071	Skolehjem med 50 værelser , Uummannaq	844015	- 474	0	- 474	0	- 474	32.000	- 32.474	- 32.474
Til intern revision	52085	Renov. af udd. bygnigner Qeq. kommunia	844012	- 21	0	- 21	- 41	- 62	309	- 371	- 330
Til intern revision	52087	Erstaningsbyggeri for NI+GU, Qaoqrotq	844012	471	0	471	- 1	470	104.400	- 103.930	- 104.385
Til intern revision	52088	Erstatningsbyggeri for Ledelsesakademi, Nuuk	844012	- 551	0	- 551	0	- 551	12.500	- 13.051	- 13.051
Til intern revision	52094	Renovering af Knud Rasmussenip Højskolia	844012	0	0	0	0	0	0	0	0
Til intern revision	52101	Projektering af standardkollegier, 2015	844015	- 304	0	- 304	0	- 304	2.078	- 2.382	- 2.382
Til intern revision	52102	Projektering af standardkollegier, 2016	844015	136	0	136	- 3	133	3.000	- 2.867	- 2.938
Til intern revision	52103	Projektering af standardkollegier, 2017	844015	994	- 900	94	- 80	14	2.100	- 2.086	- 2.127
Til intern revision	52117	Renovering af kollegier, Paamiut	844015	4.968	- 5.000	- 32	0	- 32	0	- 32	- 32
Til intern revision	54007	Tilskud til renovering af idrætshaller	844014	- 612	0	- 612	- 2.744	- 3.356	0	- 3.356	- 3.356
Til intern revision	54008	Projektering af kunstgræsbaner, 2017	844014	600	- 600	0	- 1	- 1	0	- 1	- 1

Til intern revision	74002	Miljøafbødende foranstaltninger, Dundas	877502	1	0	1	0	1	- 13.742	13.743	13.743
Til intern revision	90022	Pisariillisaaneq-projektet, ERP	822002	- 36.148	0	- 36.148	0	- 36.148	0	- 36.148	- 36.148
Til intern revision	97085	Renovering B-294, B-295	877213	0	0	0	0	0	9.454	- 9.454	- 9.454
Til intern revision	97150	Renovering diverse steder, 2009	877213	- 4	0	- 4	0	- 4	18.432	- 18.436	- 15.926
Til intern revision	97151	Renovering diverse steder, 2010	877213	0	0	0	0	0	3.337	- 3.337	- 3.337
Til intern revision Total				- 108.680	- 28.218	- 136.898	1.731	- 135.168	973.833	- 1.109.001	- 1.117.867
		Afrunding Primo		591							
Hovedtotal				1.212.966	414.002	1.626.377	- 548.285	1.078.683	4.922.544	- 3.844.440	- 4.044.310

Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber

Kapitel 4

Finanslov, årsbudget m.v.

Anlæg, renovering m.v.

§ 14. Finanslovsforslaget indeholder forslag til bevillinger til projektering af Grønlands Selvstyres anlægs- og renoveringsopgaver.

Stk. 2. Finanslovsforslaget indeholder forslag til bevillinger til udførelse af Grønlands Selvstyres anlægs- og renoveringsopgaver.

§ 15. Finanslovsforslaget indeholder forslag til bevillinger til Grønlands Selvstyres investeringer i fast ejendom, anlæg og andre aktiver.

Stk. 2. Finanslovsforslaget indeholder forslag til bevillinger til Grønlands Selvstyres lånetilsagn til anlægs- og renoveringsopgaver.

Stk. 3. Finanslovsforslaget indeholder forslag til bevillinger til Grønlands Selvstyres tilskud til anlægs- og renoveringsopgaver.

§ 16. Naalakkersuisut udarbejder en årlig redegørelse til Inatsisartut om anvendelsen af de i § 14 og § 15 nævnte bevillinger. Redegørelsen skal blandt andet indeholde en separat status for henholdsvis nye projekter, igangværende projekter og afsluttede eller aflyste projekter.

§ 17. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om overførsel af de i § 14 og § 15 nævnte bevillinger til senere finansår, når et mindre forbrug skyldes forsinkelser vedrørende en anlægs- eller renoveringsopgave
